



Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TONICAPAN



San Francisco El Alto, martes, 17 de diciembre de 2019
Oficio No. 219-2019
Ref. DMP

A: César Miguel Ajpop Zapeta
Unidad de Información Pública Municipal

Por medio de la presente se le hace entrega de la información requerida según Circular No. 10-2019. UIPM de fecha 06 de diciembre del presente año 2019, la cual van adjuntas al presente oficio:

Sin nada más que agregar, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,



Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
Colegiado N.º 125
Municipalidad de San Francisco El Alto, Tonicapan

Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
Director Municipal de Planificación

Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



MISION

Somos una Institución de Gobierno Municipal que impulsa el desarrollo integral, equitativo y sostenible del Municipio, a través de la recaudación, cooperación, gestión y administración del patrimonio municipal y los servicios públicos de manera eficaz, con una evaluación permanente, promoviendo la organización y participación activa y voluntaria de la población organizada en el Municipio en busca del bien común y la conservación y gestión integrada de los recursos naturales del territorio.

OBJETIVO

Brindar a la población personal para la seguridad, ordenamiento, ornato en el municipio, además del personal para atención al medio ambiente.





1,825
Suatemala, G. C.

ANEXO No.1
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
RESORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL OY AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

No.	CODIGO SNP	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	No. DE CONVENIO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	APORTES			MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	EJECUCION DEVENGADA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	AVANCE FINANCIERO ACUMULADA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		% DE AVANCE FISICO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
										CODEDE	MUNICIPALIDAD	COMUNIDAD				TOTAL	VALOR	
1	224333	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	53-2019	15-2019	29/08/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ANGELEMANUEL MARTINEZ JUAREZ	11/09/2019	-	Q500,000.00	Q5,000.00	Q538.00	Q505,538.00	Q	Q 189,375.00	Q 189,375.00	81.16%	95.00%
2	224409	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	54-2019	16-2019	29/08/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	KEVIN JARISEM GARCIA HERRERA	21/09/2019	-	Q400,000.00	Q5,000.00	Q800.00	Q405,500.00	Q	Q 81,120.00	Q 81,120.00	20.00%	88.00%
3	224230	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE LOS PINALES, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	55-2019	17-2019	29/08/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	17/09/2019	-	Q800,000.00	Q5,000.00	Q750.00	Q805,750.00	Q	Q 315,104.00	Q 315,104.00	76.59%	92.00%
4	224228	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, PARAJE CHUQUI, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	56-2019	18-2019	06/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	KEVIN JARISEM GARCIA HERRERA	21/09/2019	-	Q500,000.00	Q5,000.00	Q520.00	Q505,520.00	Q	Q 252,500.00	Q 252,500.00	49.95%	72.00%
5	224234	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y TUBERIA DE CONDUCCION), BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	57-2019	19-2019	06/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	21/09/2019	22/11/2019	Q750,000.00	Q5,000.00	Q711.00	Q755,711.00	Q	Q 151,142.20	Q 151,142.00	20.00%	100.00%
6	224229	AMPLIACION INSTITUTO BASICO, SECTOR PABAJ, PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	60-2019	20-2019	06/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	JOSE ESTUARDO HERRERA NORIEGA	27/09/2019	-	Q300,000.00	Q2,500.00	Q800.00	Q303,300.00	Q	Q 60,660.00	Q 60,660.00	20.00%	90.00%
7	224236	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHUICHAI, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	58-2019	22-2019	10/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	JUAN RAMOS HERNANDEZ	27/09/2019	-	Q500,000.00	Q5,000.00	Q575.00	Q505,575.00	Q	Q 252,500.00	Q 252,500.00	85.53%	95.00%
8	224410	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, PARAJE PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	59-2019	21-2019	10/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	KEVIN JARISEM GARCIA HERRERA	27/09/2019	-	Q400,000.00	Q5,000.00	Q545.00	Q405,545.00	Q	Q 81,109.00	Q 81,109.00	20.00%	76.00%
9	226499	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	72-2019	30-2019	23/10/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS AFDOP RIAREZ	25/10/2019	-	Q1,341,853.00	Q547.00	Q100.00	Q1,342,500.00	Q	Q 268,500.00	Q 268,500.00	20.00%	40.00%
10	224343	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, SECTOR CHITOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	68-2019	23-2019	26/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	08/10/2019	-	Q600,000.00	Q4,805.00	Q275,000.00	Q879,805.00	Q	Q 175,961.00	Q 175,961.00	20.00%	90.00%
11	224437	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	69-2019	24-2019	26/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	MIGUEL HATZ SALES	08/10/2019	-	Q400,000.00	Q5,000.00	Q722.00	Q405,722.00	Q	Q 81,114.40	Q 81,114.40	20.00%	90.00%
12	224228	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHIVENTUR, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	70-2019	25-2019	27/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS AFDOP RIAREZ	10/10/2019	-	Q300,000.00	Q1,700.00	Q100.00	Q301,800.00	Q	Q 60,360.00	Q 60,360.00	20.00%	98.00%
13	224278	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, 20 DE OCTUBRE, CENTRO ALDEA TACAIALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	26-2019	26-2019	27/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ROLANDO ELEUTERIO TELU CIA	08/10/2019	-	Q500,000.00	Q5,000.00	Q800.00	Q505,800.00	Q	Q 101,120.00	Q 101,120.00	20.00%	85.00%
14	224326	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	74-2019	27-2019	27/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	MARLEN RENE ANQUETA ESCOBAR	08/10/2019	-	Q400,000.00	Q5,000.00	Q500.00	Q405,500.00	Q	Q 81,100.00	Q 81,100.00	20.00%	83.00%
15	224236	AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA MEB, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	75-2019	28-2019	02/10/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	08/10/2019	-	Q750,000.00	Q5,000.00	Q512.00	Q755,512.00	Q	Q 503,333.50	Q 503,333.50	66.62%	95.00%
16	224232	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDO NIVEL), PARAJE PATZUTZUTZ, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	71-2019	29-2019	03/10/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS AFDOP JUAREZ	10/10/2019	-	Q826,767.00	Q4,833.00	Q100.00	Q831,500.00	Q	Q 166,300.00	Q 166,300.00	20.00%	95.00%

ARG. FELIPE RODERICO ITZEP SAC
DIRECTOR DMP

Director Municipal de Planificación
Arg. Felipe Roderico Itzep Sac
Colegiado 3,125
Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán





1,825 m.
Guatemala, C. A.

ANEXO No.2
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cifras expresadas en (quetzales)

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	EJECUCION DEVENGADA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		% DE AVANCE FISICO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
												VALOR	%	
1	230212	DOTACION DE AVES PONEDORAS AÑO 2019, VARIAS COMUNIDADES, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	12-2019	17/05/2019	MUNICIPALIDAD	LUCIA FRANCISCA CRUZ RAMIREZ DE HERNANDEZ	23/05/2019	27/05/2019	Q 324,972.00	Q -	Q 324,972.00	Q 324,972.00	100.00%	100.00%
2	235445	DOTACION DE MATERIALES PARA CALLE Y CAMINO VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	14-2019	01/06/2019	MUNICIPALIDAD	ROSAURA PAXTOR CHANAX	14/06/2019	14/06/2019	Q 1,125,000.00	Q -	Q 1,125,000.00	Q 1,125,000.00	100.00%	100.00%
3	213560	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PARAJE PACAMAN CHULUL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	10-2019	25/04/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	14/05/2019	08/07/2019	Q 335,500.00	Q -	Q 335,500.00	Q 335,500.00	100.00%	100.00%
4	230105	AMPLIACION EDIFICIO (S) ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	11-2019	25/04/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE MAX CHOJOLAN TURNIL	14/05/2019	11/09/2019	Q 558,625.00	Q -	Q 446,900.00	Q 446,900.00	95.00%	100.00%
5	-	COMPRA DE LAMPARAS TIPO LED PARA EL PROYECTO CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	13-2019	04/06/2019	MUNICIPALIDAD	JAIME AURELIANO AGUILAR MATIAS	28/06/2019	28/06/2019	Q 480,000.00	Q -	Q 480,000.00	Q 480,000.00	100.00%	100.00%
6	230106	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) SALON DE USOS MULTIPLES ALCALDIA COMUNITARIA, PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	31-2019	15/11/2019	MUNICIPALIDAD	RAMON ANIBAL HERNANDEZ OSORIO	28/11/2019	-	Q 325,000.00	Q -	Q 65,000.00	Q 65,000.00	20.00%	20.00%
7	230436	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHILIMOB, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	32-2019	15/11/2019	MUNICIPALIDAD	ARNOLDO POJOY LOPEZ	28/11/2019	-	Q 435,660.75	Q -	Q 87,132.15	Q 87,132.15	20.00%	20.00%
8	230435	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CEMENTERIO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	33-2019	15/11/2019	MUNICIPALIDAD	MARLON REHE ARQUETA ESCOBAR	28/11/2019	-	Q 325,000.00	Q -	Q 65,000.00	Q 65,000.00	20.00%	20.00%
9	230433	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASTAY, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	34-2019	25/11/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	-	-	Q 435,500.00	Q -	Q 87,100.00	Q 87,100.00	20.00%	20.00%
10	230113	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, (ENTECHADO DE PATIO), ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	35-2019	25/11/2019	MUNICIPALIDAD	MARLON REHE ARQUETA ESCOBAR	-	-	Q 559,000.00	Q -	Q 111,800.00	Q 111,800.00	20.00%	20.00%
11	231296	AMPLIACION EDIFICIO (S) ALCALDIA COMUNITARIA SEGUNDO NIVEL, BARRIO CHUISIGUAN ENTRE LA SEGUNDA CALLE Y TERCERA AVENIDA DE LA ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	36-2019	25/11/2019	MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AJPOP JUAREZ	-	-	Q 559,450.00	Q -	Q 111,890.00	Q 111,890.00	20.00%	20.00%

F: ARQ. FELIPE RODERICO ITZEP SAC
DIRECTOR DHP



Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
Colegiado 3,125
Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicaacán



El Alto



E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603






**INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
A LA FECHA 31 DE NOVIEMBRE
AÑO 2019.**

1. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS CODEDE AÑO 2019

Se informa la supervisión de los trabajos realizados y el avance físico estimado a la fecha 31 de noviembre.






<p>1</p>	<p>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos de repello y cernido de paredes, vigas y losa, se verifican trabajos de colocación de piso, instalaciones eléctricas de luz y fuerza. Se recomienda a los encargados de la obra mantener las medidas de puertas y ventanas en el proceso de tallado. Se estima un avance físico del 95 %.</p>	
<p>2</p>	<p>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE LOS PINALES, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos de repello y cernido de paredes, losa y vigas, tanto del primero como del segundo nivel. Así mismo se verifica la culminación del módulo de gradas, se recomienda prevenir la salida del agua de lluvia que cae en las gradas hacia el primer nivel. Se verifican trabajos de colocación de piso e instalaciones eléctricas. Se estima un avance físico del 92%.</p>	

"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

3	<p>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos para continuar la instalación de tubería HG de 1 ½" y sus respectivo anclajes, así mismo la construcción de los pasos de zanjón. Se estima un avance físico del 88%.</p>	 
4	<p>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, PARAJE CHUQUI, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos de armado de refuerzo de vigas y losa, así mismo se recomienda la proporción adecuada de materiales para la fabricación del concreto a utilizar en fundición de losas y vigas, de acuerdo a indicaciones de planos y especificaciones. Se estima un avance físico del 72%.</p>	 
5	<p>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y TUBERIA DE CONDUCCION), BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</p>	<p>Se supervisan los trabajos finales de instalación de tubería galvanizada de diámetro 3", se verifican también los anclajes para la misma tubería. Se concluye con la longitud de instalación de tubería Hg que es de 1636.20 metros. Se concluyen todos los trabajos, el avance físico es del 100%.</p>	








"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

			
<p>6</p>	<p>AMPLIACION INSTITUTO BASICO, SECTOR PABAJ, PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos de repello y cernido de losa vigas y paredes, se verifica la calidad de los materiales para el repello. Se verifican trabajos de instalación de piso e instalaciones eléctricas de luz y fuerza. Se estimada un avance físico del 90%.</p>	 
<p>7</p>	<p>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</p>	<p>Se supervisan los trabajos de repello y cernido de paredes, losa y vigas de ambos niveles de la construcción, se supervisan trabajos de instalación de piso y trabajos de instalaciones eléctricas de luz y fuerza. Se estima un avance físico del 95%.</p>	 



"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"




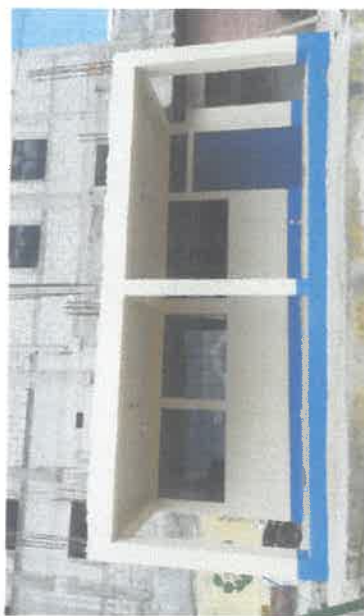

8	<p>MEJORAMIENTO PUERTO DE SALUD, PARAJE PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN</p>	<p>Se supervisan trabajos de levantado de muro, fundición de sofera intermedia y corono y fundición de columnas. Se recomiendan las proporciones indicadas en la planificación para la elaboración del concreto. Así mismo se tiene en obra la estructura metálica del techo para ser instalada. Se tiene un avance físico estimado del 76%.</p>	 
9	<p>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, SECTOR CHITOCCHÉ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN</p>	<p>Se realiza supervisión de la perforación de pozo, e instalación de tubería de revestimiento lisa y ranurada. Se estima un avance físico del 90%.</p>	 
10	<p>CONSTRUCCION PUERTO DE SALUD, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN</p>	<p>Se supervisan los trabajos de armado de refuerzo de vigas y losas, se realizan recomendaciones sobre la proporción de materiales a utilizar para la fundición de la losa. Así mismo se verifican trabajos de excavación de pozo de absorción Se estima un avance físico del 65%.</p>	 <p>Pozo de absorción.</p>



"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

<p>11</p>	<p>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHIVARRETO, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos de tallado de columnas y vigas, así como la correcta instalación del material eléctrico para iluminación. Se verifica la aplicación de pintura según lo indicado en especificaciones técnicas. Se estima un avance físico del 98%</p>	
<p>12</p>	<p>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, 20 DE OCTUBRE, CENTRO ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos de armado de refuerzo vigas y losa, y se realizan recomendaciones sobre las proporciones de material a utilizar en el concreto para la fundición de los mismos. Se verifica que el curado de losa sea el adecuado, se recomienda mantener siempre húmeda la superficie de la losa. Se tiene un avance estimado del 85%.</p>	

"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

<p>13</p>	<p>CONSTRUCCION PUUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</p>	<p>Se realiza supervisión de trabajos de repello de paredes y losa. Se verifica la calidad de los materiales para el repello. Así mismo se inician trabajos de colocación de piso e instalaciones eléctricas. Se estima un avance físico del 83%.</p>	 
<p>14</p>	<p>AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IMEB, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos tanto en el módulo del primer nivel como del segundo nivel de repello y cernido de paredes, losa y viga, colocación de piso, instalaciones eléctricas de luz y fuerza y aplicación de pintura Se estima un avance físico del 95%.</p>	 <p>Segundo nivel.</p>  <p>Primer nivel.</p>
<p>15</p>	<p>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDO NIVEL), PARAJE PATZUTZUTZ, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos de repello y cernido, instalación de techo de estructura metálica y colocación de piso. Se verifica que los materiales a utilizar sean los adecuados de acuerdo a planos de construcción. Se estima un avance físico del 95%.</p>	





		
<p>16</p>	<p>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se verifican trabajos de colocación de armado y formateado de tanques Imhoff, se verifican las medidas para que cumplan con planos de construcción, se recomienda la proporción adecuada de agregados para la fundición del concreto para los tanques. Se estima un avance físico del 40%.</p>







1. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES AÑO 2019

Se informa la supervisión de los trabajos realizados y el avance físico estimado a la fecha 31 de noviembre.

<p>1</p>	<p>CONSTRUCCION EDIFICIO (S) SALON DE USOS MULTIPLES ALCALDIA COMUNITARIA, PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN.</p>	
<p>Se supervisan trabajos excavación para zapatas y cimientto corrido. Se verifica el armado de zapatas y fundición de las mismas, así com el armado longitudinal y transversal de columnas.</p> <p>Se tiene un avance físico estimado del 20%.</p>		

"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

<p>2</p>	<p>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-LIMOB, ALDEA TACAIALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN.</p>	<p>Se supervisan trabajos de corte de material para nivelación del camino y suministro, tendido y compactación de base. Se verifica el espesor de la base colocada, así como la correcta compactación con la maquinaria adecuada. Se estima un avance físico del 20%.</p>	 
<p>3</p>	<p>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CEMENTERIO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN.</p>	<p>Se supervisan trabajos de corte y nivelación y corte para relleno, así mismo se verifica el material adecuado de base granular, el cual cumple con el espesor indicado y la compactación según especificaciones técnicas. Se estima un avance físico del 20%.</p>	 



Juan Gustavo Alva Rosales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 13106

Ing. Juan Gustavo Alva Rosales
Supervisor Municipal de Obras
San Francisco El Alto, Totonicapán
