



1,825
Guatemala, C.A.

Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

San Francisco El Alto, martes, 12 de noviembre de 2019
Oficio No. 219-2019
Ref. DMP

A: César Miguel Ajpop Zapeta
Unidad de Información Pública Municipal

Por medio de la presente se le hace entrega de la información requerida según Circular No. 09-2019. UIPM de fecha 04 de noviembre del presente año 2019, la cual van adjuntas al presente oficio:

Sin nada más que agregar, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,



Arq. Felipe Roderico Itezop Sac
Director Municipal de Planificación

Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Itezop Sac
Colegiado 3,125
Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán

Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



1,825
Guatemala, C.A.

Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

MISION

Somos una Institución de Gobierno Municipal que impulsa el desarrollo integral, equitativo y sostenible del Municipio, a través de la recaudación, cooperación, gestión y administración del patrimonio municipal y los servicios públicos de manera eficaz, con una evaluación permanente, promoviendo la organización y participación activa y voluntaria de la población organizada en el Municipio en busca del bien común y la conservación y gestión integrada de los recursos naturales del territorio.

OBJETIVO

Brindar a la población personal para la seguridad, ordenamiento, ornato en el municipio, además del personal para atención al medio ambiente.



Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



1,825
Guatemala, C. A.

Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

ANEXO No.2
MUNICIPALIDAD DE: SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(Cifras expresadas en quetzales)

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	EJECUCION DEVENGADA AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		% DE AVANCE FISICO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
												VALOR	%	
1	230212	DOTACION DE AVES PONEADORAS AÑO 2019, VARIAS COMUNIDADES, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	12-2019	17/05/2019	MUNICIPALIDAD	LUCIA FRANCISCA CRUZ RAMIREZ DE HERNANDEZ	23/05/2019	27/05/2019	Q 324,972.00	Q -	Q 324,972.00	Q 324,972.00	100.00%	100.00%
2	235445	DOTACION DE MATERIALES PARA CALLE Y CAMINO VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	14-2019	01/06/2019	MUNICIPALIDAD	ROSAURA PAXTOR CHANAX	14/06/2019	-	Q 1,125,000.00	Q -	Q 352,275.00	Q 352,275.00	84.00%	90.00%
3	213560	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PARAJE PACAMAN CHUUL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	10-2019	25/04/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	14/05/2019	08/07/2019	Q 335,500.00	Q -	Q 335,500.00	Q 335,500.00	100.00%	100.00%
4	230105	AMPLIACION EDIFICIO (S) ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	11-2019	25/04/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE MAX CHOJOLAN TURNIL	14/05/2019	-	Q 558,625.00	Q -	Q 446,900.00	Q 446,900.00	80.00%	100.00%
5	-	COMPRA DE LAMPARAS TIPO LED PARA EL PROYECTO CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	13-2019	04/06/2019	MUNICIPALIDAD	JAIME AURELIANO AGUILAR MATIAS	28/06/2019	28/06/2019	Q 480,000.00	Q -	Q 480,000.00	Q 480,000.00	100.00%	100.00%



F: 
ARQ. FELIPE ROBERTO ITZEP SAC
DIRECTOR DMP

Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roberto Itzep Sac
Colegiado 3,125
Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán

Vo.Bo

F: 
ANTONIO ALVAREZ MALDONADO
ALCALDE MUNICIPAL



Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603

ANEXO No.1
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

No.	CODIGO SINP	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	No. DE CONVENIO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	APORTES			MONTO DEL CONTRATO TOTAL	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	EJECUCION DEVENGADA AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		% DE AVANCE FINICO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
										EDADE	MUNICIPALIDAD	COMUNIDAD				VALOR	%	
1	224333	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	53-2019	15-2019	29/08/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ANGEL EMANUEL MARTINEZ JUAREZ	17/09/2019	-	Q500,000.00	Q5,000.00	Q538.00	Q505,538.00	Q -	Q 103,107.60	Q -	20.00%	80.00%
2	224409	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SACUCOOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	54-2019	16-2019	29/08/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	KEVIN JANSEM GARCIA HERRERA	27/09/2019	-	Q400,000.00	Q5,000.00	Q800.00	Q405,800.00	Q -	Q 81,220.00	Q -	20.00%	65.00%
3	224230	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE LOS PINALES, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	55-2019	17-2019	29/08/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	17/09/2019	-	Q800,000.00	Q5,000.00	Q750.00	Q805,750.00	Q -	Q 122,150.00	Q -	20.00%	68.00%
4	224226	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, PARAJE CHUQUI, ALDEA PAXIKIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	56-2019	18-2019	06/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	KEVIN JANSEM GARCIA HERRERA	27/09/2019	-	Q500,000.00	Q5,000.00	Q520.00	Q505,520.00	Q -	Q 101,104.00	Q -	20.00%	40.00%
5	224234	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y TUBERIA DE CONDUCCION), BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	57-2019	19-2019	06/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	27/09/2019	-	Q750,000.00	Q5,000.00	Q711.00	Q755,711.00	Q -	Q 151,242.20	Q -	20.00%	80.00%
6	224229	AMPLIACION INSTITUTO BASICO, SECTOR PABAJ, PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	60-2019	20-2019	06/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	JOSE ESTUARDO HERRERA NORIEGA	27/09/2019	-	Q300,000.00	Q2,500.00	Q800.00	Q303,300.00	Q -	Q 60,660.00	Q -	20.00%	75.00%
7	224236	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	58-2019	22-2019	10/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	IRAN RAMOS HERNANDEZ	27/09/2019	-	Q500,000.00	Q5,000.00	Q575.00	Q505,575.00	Q -	Q 101,315.00	Q -	20.00%	80.00%
8	224410	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, PARAJE PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	59-2019	23-2019	10/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	KEVIN JANSEM GARCIA HERRERA	27/09/2019	-	Q400,000.00	Q5,000.00	Q545.00	Q405,545.00	Q -	Q 81,109.00	Q -	20.00%	45.00%
9	226499	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	72-2019	30-2019	23/10/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS ALPOP JUAREZ	25/10/2019	-	Q1,341,853.00	Q647.00	Q100.00	Q1,342,500.00	Q -	Q 268,500.00	Q -	20.00%	25.00%
10	224343	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, SECTOR CHITOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	68-2019	23-2019	26/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	08/10/2019	-	Q800,000.00	Q4,805.00	Q275,000.00	Q879,805.00	Q -	Q 175,961.00	Q -	20.00%	25.00%
11	224437	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	69-2019	24-2019	26/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	MIGUEL HATZ SALES	08/10/2019	-	Q400,000.00	Q5,000.00	Q722.00	Q405,722.00	Q -	Q 81,114.40	Q -	20.00%	45.00%
12	224228	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHIVARRETO, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	70-2019	25-2019	27/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS ALPOP JUAREZ	10/10/2019	-	Q300,000.00	Q1,700.00	Q100.00	Q301,800.00	Q -	Q 60,360.00	Q -	20.00%	95.00%
13	224278	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, 20 DE OCTUBRE, CENTRO ALDEA TACAALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	26-2019	26-2019	27/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ROLANDO EBLUTIRO TUJ CIA	08/10/2019	-	Q500,000.00	Q5,000.00	Q600.00	Q505,600.00	Q -	Q 101,120.00	Q -	20.00%	50.00%
14	224326	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	74-2019	27-2019	27/09/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	MARLON RENE ANGELITA ESCOBAR	08/10/2019	-	Q400,000.00	Q5,000.00	Q500.00	Q405,500.00	Q -	Q 81,200.00	Q -	20.00%	50.00%
15	224238	AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IMEB, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	75-2019	28-2019	02/10/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	08/10/2019	-	Q750,000.00	Q5,000.00	Q512.00	Q755,512.00	Q -	Q 151,102.40	Q -	20.00%	75.00%
16	224232	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDO NIVEL), PARAJE PATZUTZITZ, BARRIO CHULISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	71-2019	29-2019	03/10/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS ALPOP JUAREZ	10/10/2019	-	Q828,787.00	Q4,833.00	Q100.00	Q833,500.00	Q -	Q 166,300.00	Q -	20.00%	70.00%



1,825
Guatemala, C. A.



Director Municipal de Planificación
Ing. Felipe Roderico Itzep Sac
Colegiado 3,125
Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán

Va.Bo

ANTONIO LLAVEZ
ALCALDE MUNICIPAL






Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

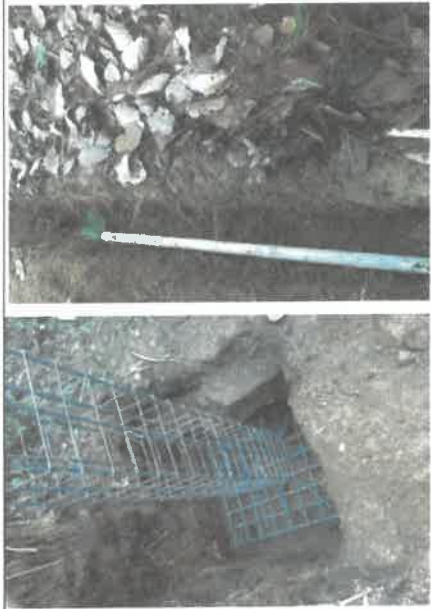



TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
A LA FECHA 31 DE OCTUBRE
AÑO 2019.**




1. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS CODEDE AÑO 2019

1	<p>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos de acondicionamiento de levantado de pared, armado y fundición de sooleras, fundición de columnas y armado y fundición de vigas y losa. Se verifica la calidad de los materiales para el concreto de fundición de losa. Se estima un avance fisico del 80%.</p>	
2	<p>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE LOS PINALES, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos de armado y fundición de solera intermedia, armado y fundición de vigas y losa del primer nivel. Se verifica la proporción de materiales para la fabricación del concreto para que sea según especificaciones técnicas. Se continúa con la supervisión de levantado de muro y fundición de columnas del segundo nivel. Se estima un avance fisico del 68%.</p>	
3	<p>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos de instalación de tubería PVC de 1 ½" de 160 y 250 PSI, así como instalación de tubería HG de 1 ½" . Se supervisa la construcción de pasos aéros, lo cual incluye armado y fundición de la estructura de zapatas y columnas, se tiene</p>	

"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"



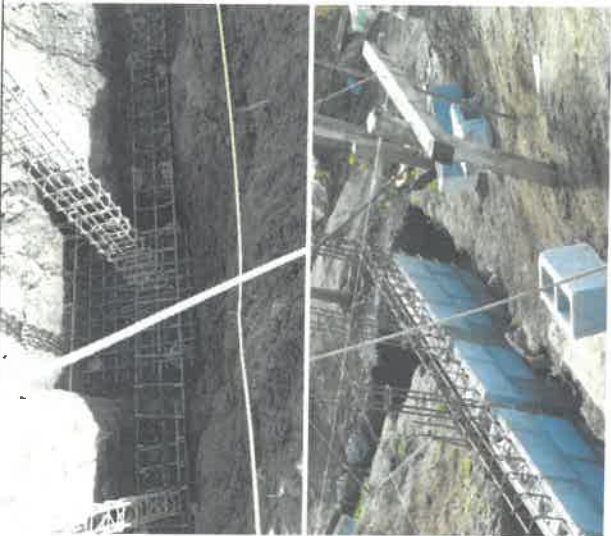

		un avance estimado del 65 %.	
4	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, PARAJE CHUQUI, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se supervisan trabajos de fundición y armado de zapatas, armado de columnas tipo 1 y tipo 2 armado y fundición de cimientto corrido y armado y fundición de soleras, así como levantado de muros Avance físico estimado 40%.	
5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y TUBERIA DE CONDUCCION), BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se supervisan los trabajos finales para las captaciones, así mismo se verifica la calidad de la tubería PVC y HG que cumplen con las especificaciones técnicas. Se verifican los acoples de tuberías y anclajes de concreto para tubería superficial. Se estima un avance del 80 %.	
6	AMPLIACION INSTITUTO BASICO, SECTOR PABAJ, PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN	Se supervisan trabajos finales de levantado de muro y fundición de columnas, se verifica el armado de losa, cumpliendo con separación y	

"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"


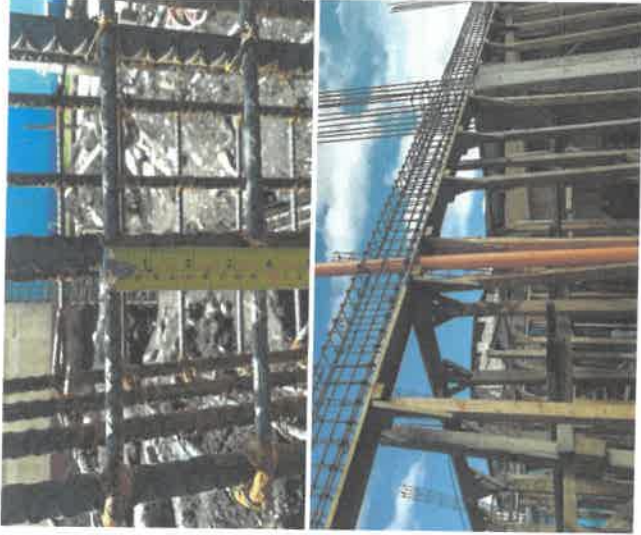

FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	tipo de armado de acuerdo a planos del estudio técnico. Se recomienda realizar la fundición de losa con la proporción indicada del concreto. Se tiene un avance físico estimado del 75%.	
7 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Se supervisan los trabajos de fundición de columnas del primer nivel, se realizan recomendaciones para la fundición de la losa y vigas del primer nivel, se supervisa armado de columnas y levantado de pared del segundo nivel. Se verifica armado de vigas y losa del segundo nivel. Se estima un avance físico del 80 %.	
8 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, PARAJE PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Se supervisan trabajos de corte de cajuela y nivelación para el pavimento de 0.15 cm de espesor. Se supervisa la construcción en taller de herrería de la estructura de techo y de la armadura de zapatas y columnas para la circulación. Se tiene un avance estimado del 45%.	



"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"






			
9	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, SECTOR CHITOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Se realiza limpieza del área de trabajo, para ubicar la maquinaria de perforación. Se tiene en el lugar de la obra la tubería para el encamisado. Se tiene un avance físico del 25%.	
10	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Se supervisan trabajos de armado y fundición de zapatas y cimientto corrido, verificando que cumplan con las medidas según planos, así mismo se verifica el armado de columnas y el evantado de paerd. Se estima un avance físico del 45%.	
11	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHIVENTUR, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Se supervisan trabajos de demolición de pared y techo existente. Se verifica la armadura de zapatas y columnas ante de ser fundidas. Así también se verifica el armado de vigas y losa previo a la fundición, lo cual cumple con planos y especificaciones técnicas. Se estima un avance físico del 85%.	

"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

		
<p>12</p>	<p>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, 20 DE OCTUBRE, CENTRO ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</p>	 <p>Se supervisan trabajos de armado de viga de amarre, se verifica el armado de columnas tipo A de 50x50 cm, el cual cumple con las barras longitudinales y el refuerzo transversal requerido en planos. Así mismo se verifica el armado de vigas y entarimado de losa. Se estima un avance físico del 50%.</p>
<p>13</p>	<p>CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</p>	 <p>Se supervisan trabajos de levantado de muro y armado de soleras. Así también se verifica el armado de las columnas tipo 2 de 0.70x0.19 cm, el cual tiene el armado correcto y las dimensiones de acuerdo a lo contratado. Así mismo se verificó el armado de vigas. Se estima un avance físico del 50%.</p>



"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

14	<p>AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IMEB, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos en el segundo nivel, de armado y fundición de columnas, conjuntamente con el levantado de pared. Así mismo se verifica el armado de vigas y losas. En el módulo del primer nivel se verifican trabajos de levantado de pared y fundición de soleras, así también el armado de vigas y losa. Se estima un avance físico del 75%.</p>	 <p>Segundo nivel.</p>  <p>Primer nivel.</p>
15	<p>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDO NIVEL), PARAJE PATZUTZUTZ, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos de construcción de zapatas y columnas del pasillo del primer nivel, se realizan recomendaciones acerca de la fundición de la losa. Por otro lado se supervisan los trabajos de levantado de muro, armado y fundición de soleras del segundo nivel. Se tiene también avances en el módulo de gradas. Se estima un avance físico del 70%.</p>	 
16	<p>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se verifican trabajos de trazo, nivelación y conformación del terreno, se supervisan trabajos de levantado de muro y armado y fundición del muro de circulación. Así mismo se inician trabajos de la caja de unión y tanques imhoff. Se estima un avance físico del 25%.</p>	



SAN FRANCISCO EL ALTO
TOTONICAPÁN

**Dirección
Municipal de
Planificación**
San Francisco El Alto
Totonicapán

"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

			
--	--	--	---

Es todo lo que se informa.



Juan Gustavo Alva Rosales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO NO. 13106

Ing. Juan Gustavo Alva Rosales
Supervisor Municipal de Obras
San Francisco El Alto, Totonicapán
