



1,825
Guatemala, C. A.

Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN


San Francisco El Alto, viernes, 09 de noviembre de 2018
Oficio No. 136-2018
Ref. DMP


A: Cesar Miguel Ajpop Zapeta
Unidad de Información Pública Municipal

Por medio de la presente se le hace entrega de la información requerida según Circular No. 06-2018. UIPM de fecha 26 de Octubre del presente año 2018, la cual van adjuntas al presente oficio:

Sin nada más que agregar, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,


Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
Director Municipal de Planificación



Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



1,825
Guatemala, C. A.

Municipalidad de San Francisco El Alto


DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

MISION

Somos una Institución de Gobierno Municipal que impulsa el desarrollo integral, equitativo y sostenible del Municipio, a través de la recaudación, cooperación, gestión y administración del patrimonio municipal y los servicios públicos de manera eficaz, con una evaluación permanente, promoviendo la organización y participación activa y voluntaria de la población organizada en el Municipio en busca del bien común y la conservación y gestión integrada de los recursos naturales del territorio.

OBJETIVO

Brindar a la población personal para la seguridad, ordenamiento, ornato en el municipio, además del personal para atención al medio ambiente.


Roberto Steep Sac
Director Municipal de Planificación
Colegiado 3.125
Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán



Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603

ANEXO No.1
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
 REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
 (Cifras expresadas en Quetzales)

No.	CODIGO SNP	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	APORTES			MONTO DEL CONTRATO TOTAL	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIO 2017	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIO 2018	AVANCE FINANCIERO ACUMULADA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018		% DE AVANCE FISICO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
										MUNICIPALIDAD	CODEDE	COMUNIDAD				Valor	%	
1	189383	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, PARAJE CHONIMACORRAL, SAN ANTONIO SISA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	001-2017	008-2017	14/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ESTEBAN RAMON MARTINES GOMEZ	25/09/2017	20/02/2018	Q. 9,900.00	Q. 600,000.00	Q. 100.00	Q. 610,000.00	Q. 122,000.00	Q. 487,900.00	Q. 609,900.00	100.00%	100.00%
2	185933	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL, LA REFORMITA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	013-2017	009-2017	14/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ANGEL ROBERTO GARCIA SOSA	29/09/2017	26/01/2018	9,600.00	Q. 750,000.00	Q. 1,000.00	Q. 760,600.00	Q. 152,120.00	Q. 607,480.00	Q. 759,600.00	100.00%	100.00%
3	189381	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO, PARAJE PACAMAN Y CHUUL, ALDEA CHIRRENOK, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	019-2017	010-2017	14/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ESTEBAN RAMON MARTINES GOMEZ	25/09/2017	22/01/2017	9,500.00	Q. 500,000.00	Q. 100.00	Q. 510,000.00	Q. 102,000.00	Q. 407,900.00	Q. 509,900.00	100.00%	100.00%
4	189377	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	020-2017	011-2017	14/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ANGEL ROBERTO GARCIA SOSA	29/09/2017	26/01/2018	10,000.00	Q. 400,000.00	Q. 700.00	Q. 410,700.00	Q. 82,140.00	Q. 327,860.00	Q. 410,000.00	100.00%	100.00%
5	172535	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PARVULOS), 3RA CALLE ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	023-2017	012-2017	18/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	28/09/2017	08/01/2018	10,000.00	Q. 259,880.00	Q. 600.00	Q. 270,600.00	Q. 54,120.00	Q. 215,860.00	Q. 269,980.00	100.00%	100.00%
6	186478	AMPLIACION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	022-2017	013-2017	18/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	28/09/2017	22/01/2018	5,000.00	Q. 300,000.00	Q. 813.00	Q. 305,813.00	Q. 61,162.60	Q. 243,837.40	Q. 305,000.00	100.00%	100.00%
7	186464	AMPLIACION PUESTO DE SALUD, PARAJE PALEMOR, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	023-2017	014-2017	18/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	FLORDILIA AMARIUS MENDOZA GONZALEZ	28/09/2017	26/01/2018	9,000.00	Q. 400,000.00	Q. 500.00	Q. 409,500.00	Q. 81,900.00	Q. 327,100.00	Q. 409,000.00	100.00%	100.00%
8	186439	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	024-2017	015-2017	18/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	28/09/2017	23/01/2018	10,000.00	Q. 500,000.00	Q. 735.00	Q. 510,735.00	Q. 102,147.00	Q. 407,853.00	Q. 510,000.00	100.00%	100.00%
9	152964	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PACHILAL, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	025-2017	016-2017	18/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	28/09/2017	08/02/2018	110,230.50	Q. 351,761.00	Q. 302.50	Q. 462,294.00	Q. 92,458.90	Q. 369,532.70	Q. 461,951.50	100.00%	100.00%
10	188979	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHITZOC ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	026-2017	017-2017	18/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	05/10/2017	04/01/2018	10,000.00	Q. 500,000.00	Q. 600.00	Q. 510,600.00	Q. 102,120.00	Q. 407,880.00	Q. 510,000.00	100.00%	100.00%
11	186235	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, ESCUELA PRIMARIA, PARAJE XECORRAL, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	038-2017	018-2017	18/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ROLANDO ELEUTERIO TRU CUA	13/10/2017	11/01/2018	5,000.00	Q. 300,000.00	Q. 700.00	Q. 305,700.00	Q. 61,140.00	Q. 243,860.00	Q. 305,000.00	100.00%	100.00%
12	185927	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHITULY, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	037-2017	019-2017	23/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	13/10/2017	11/01/2018	5,000.00	Q. 300,000.00	Q. 800.00	Q. 305,800.00	Q. 61,160.00	Q. 243,840.00	Q. 305,000.00	100.00%	100.00%
13	186492	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	079-2017	020-2017	10/10/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS AIPOP JUAREZ	31/10/2017	28/03/2018	9,900.00	Q. 400,000.00	Q. 100.00	Q. 410,000.00	Q. 82,000.00	Q. 245,940.00	Q. 327,940.00	74.98%	100.00%
14	186489	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	058-2017	021-2017	11/10/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	26/10/2017	08/01/2018	5,000.00	Q. 300,000.00	Q. 700.00	Q. 305,700.00	Q. 61,140.00	Q. 243,860.00	Q. 305,000.00	100.00%	100.00%
15	186393	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NEFED 380, PARAJE CHINIMARE, ALDEA PACHAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	080-2017	022-2017	13/10/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS AIPOP JUAREZ	31/10/2017	30/05/2018	9,900.00	Q. 500,000.00	Q. 100.00	Q. 510,000.00	Q. 102,000.00	Q. 311,039.00	Q. 413,039.00	78.24%	100.00%
16	152897	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION), BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	108-2017	023-2017	18/10/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ALBERTO ELADIO IMDEO GOMEZ MALDONADO	26/10/2017	30/04/2018	110,230.00	Q. 351,770.00	Q. 800.00	Q. 462,800.00	Q. 92,560.00	Q. 369,440.00	Q. 462,000.00	100.00%	100.00%
17	185903	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA PARATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	117-2017	024-2017	17/10/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ALBERTO ELADIO IMDEO GOMEZ MALDONADO	26/10/2017	30/05/2018	10,000.00	Q. 400,000.00	Q. 600.00	Q. 410,600.00	Q. 82,120.00	Q. 327,880.00	Q. 410,000.00	100.00%	100.00%
18	185997	CONSTRUCCION POZOS, ANFITEATRO ZONA 1, 2 Y 3 DEL BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	078-2017	025-2017	17/10/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	KEVIN JOSEPH EMANUEL GARCIA MESH	26/10/2017	22/01/2018	103,159.00	Q. 790,625.00	Q. 800.00	Q. 894,584.00	Q. 178,916.60	Q. 714,867.20	Q. 899,784.00	100.00%	100.00%

1,825 Guatemala

ARQ. FELIPE RODRIGO ITZEP SAC DIRECTOR DMP



Director Municipal de Planificación
 Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
 Colegiado 3,128
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán



Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestra San Francisco

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
 www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603




DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO AL 100%



PROYECTO:

CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.

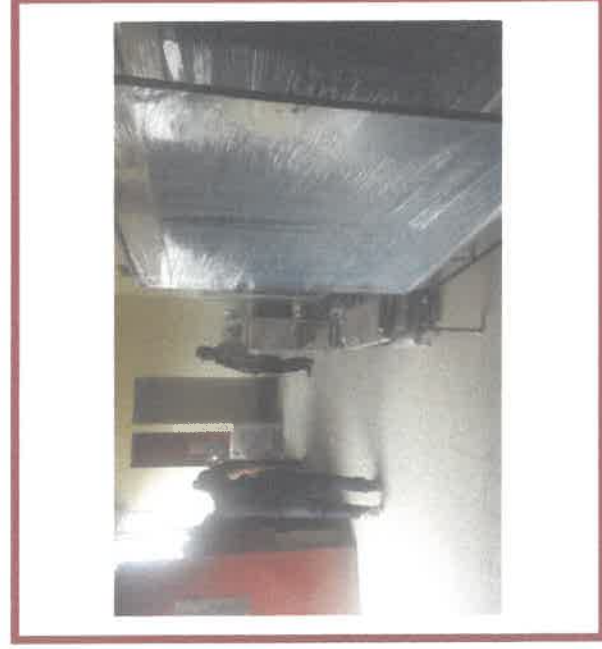

[Handwritten signature]

F. ARQ. FELIPE RODRIGO ITZEP SAC
SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD

Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Rodrigo Itzep Sac
Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán
Colegiado 3,123





DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO AL 100%



PROYECTO:

MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL, LA REFORMITA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
 Colegiado No. 3.125
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán

F. **ARQ. FELIPE RODERICO ITZEP SAC**
 SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD






DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO AL 100%



PROYECTO:

MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO, PARAJE PACAMAN Y CHUUL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

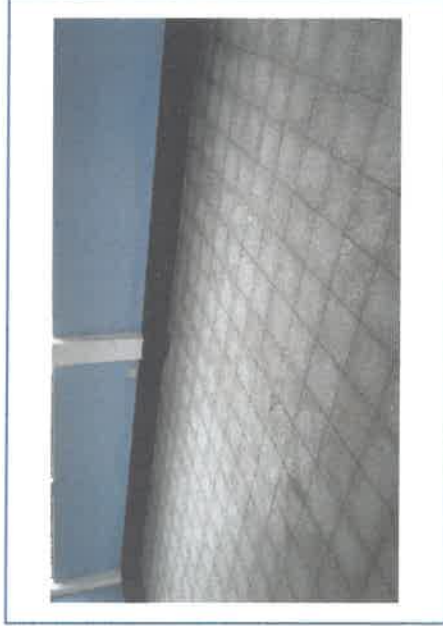

[Handwritten signature]
F. ARQ. FELIPE ROBERICO ITZEP SAC
SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD

Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roberico Itzep Sac
Municipio de San Francisco El Alto, Totoncapán



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
 Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO AL 100%



PROYECTO:
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, SECTOR CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
 Colegiado 3.125
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totoncapán

F. 
ARQ. FELIPE RODERICO ITZEP SAC
 SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD




DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO AL 100%



PROYECTO:

**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PÁRVULOS), 3ERA CALLE ZONA 1,
SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN**

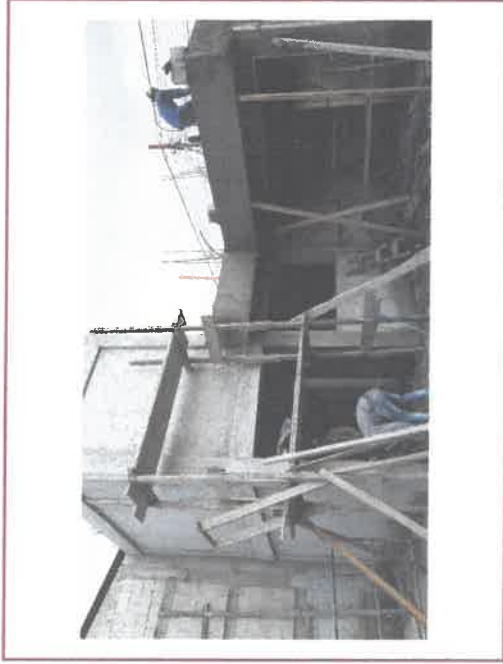


F. ARQ. FELIPE RODERICO ITZEF SAC
SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD


Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Itzef SAC
Colegiado 3,123
Municipalidad de San Francisco El Alto, Tonicapán




DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO AL 100%



AMPLIACION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

PROYECTO:

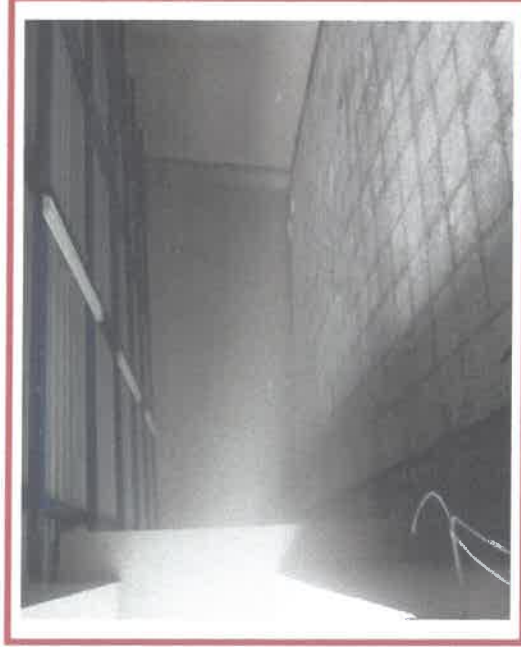

Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Irujo Jac
Colegiado 3.125

Municipalidad de San Francisco El Alto, Tonicapán


ARQ. FELIPE RODERICO IRUJO JAC
SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
 Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO AL 100%



PROYECTO:
AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

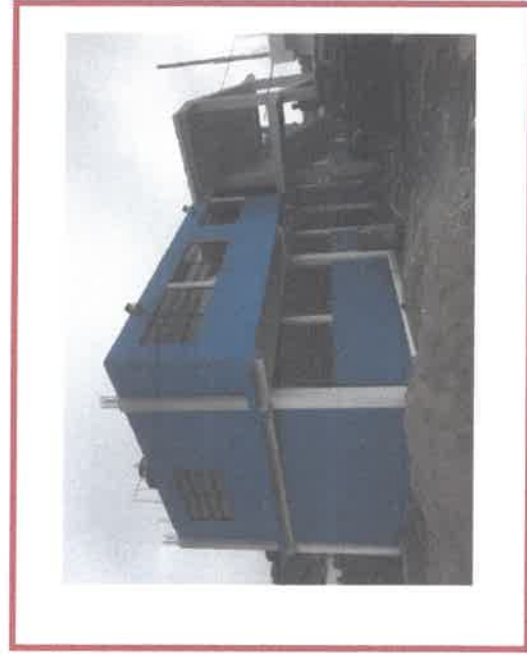

Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Lopez SAC
 Colegiado 3.125
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonacapan

[Handwritten Signature]
F. ARQ. FELIPE RODERICO LÓPEZ SAC
 SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO AL 100%



**PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO, ALDEA TACAJALVE,
 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.**




F. ARQ. FELIPE RODERICO TYSEP SAC
SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD


DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN - MUNICIPIO EL ALTO - TOTONICAPAN
Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Tysep SAC
Colegiado 3.123
Municipalidad de San Francisco El Alto, Totoncapán




DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO AL 100%



PROYECTO:

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PACHILAJ, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

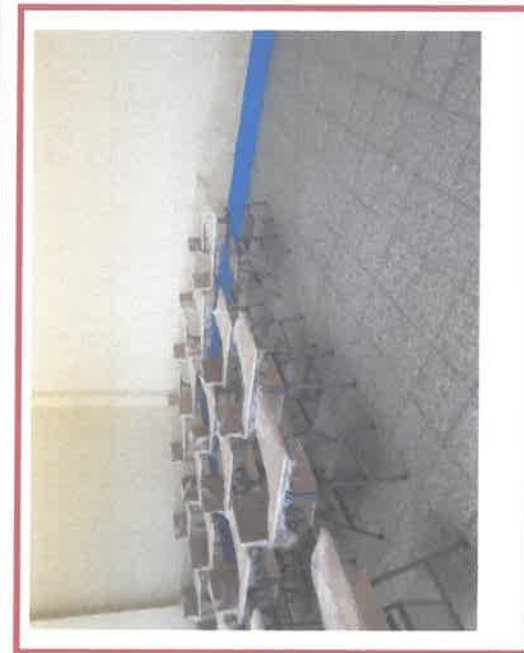

Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Rodericó Vizep Sac
Colegiado 3.123 Sac
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonacapan

F. **ARQ. FELIPE RODERICÓ VIZEP SAC**
SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD







DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO AL 100%



PROYECTO:

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHITZOC, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.

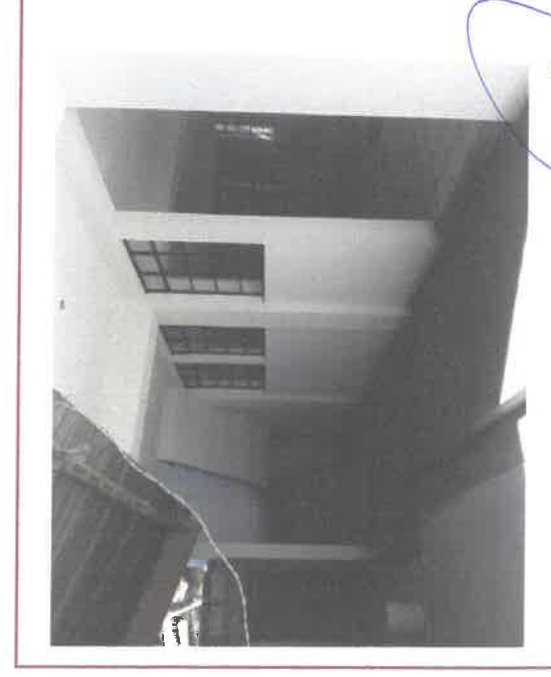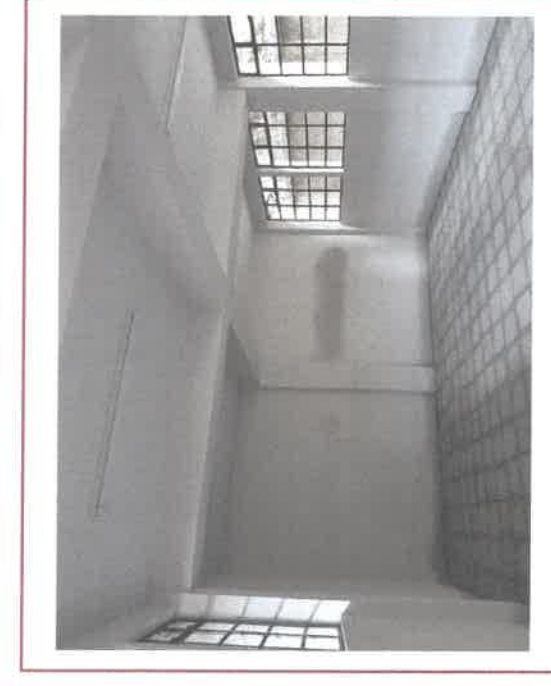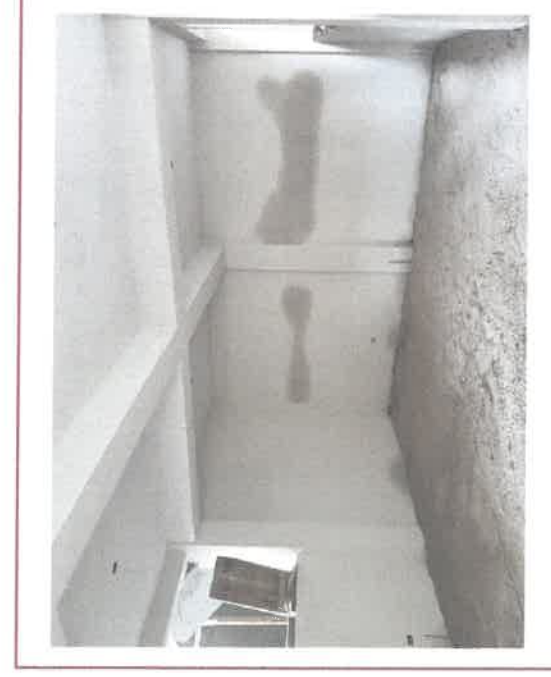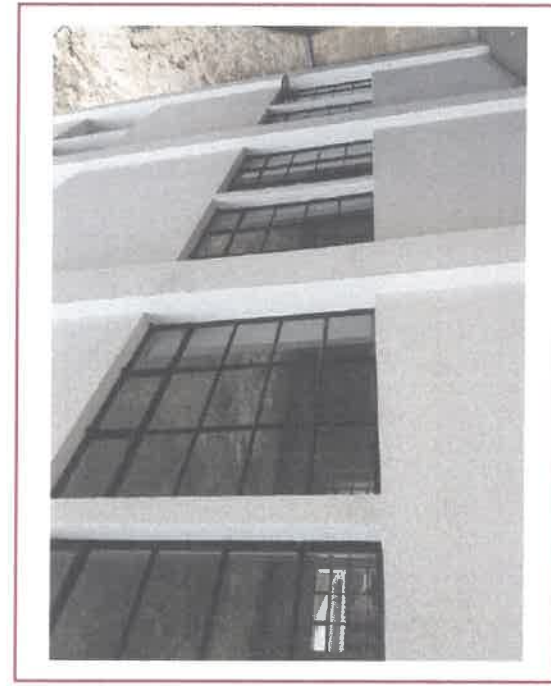

[Handwritten signature]
ARQ. FELIPE RODRIGO THERESAC
SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - INICIACION EL ALTO
SAN FRANCISCO EL ALTO
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Arq. Felipe Rodrigo Theresac
Colegiado 3.123
Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán






DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO AL 100%



PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA PRIMARIA, PARAJE XECORRAL, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.

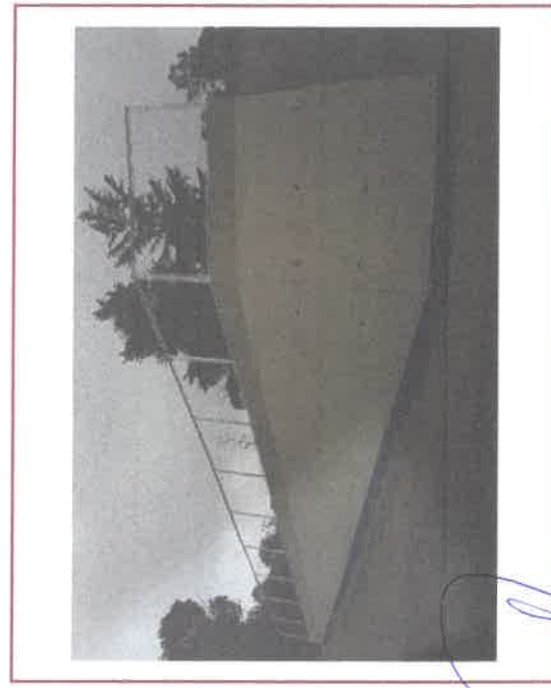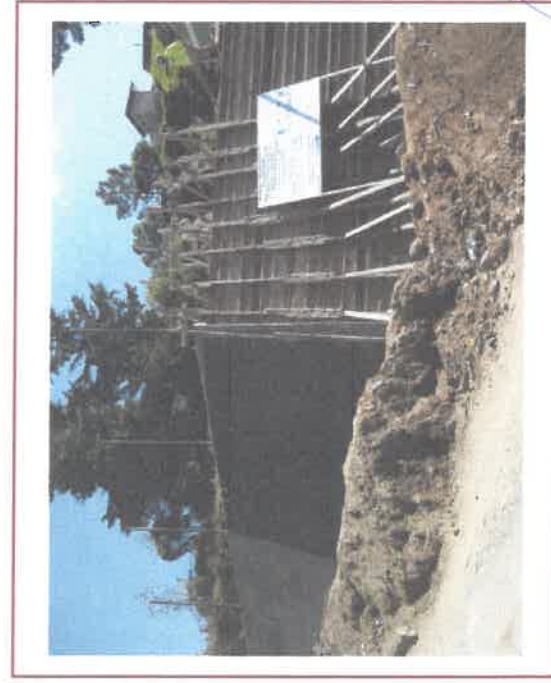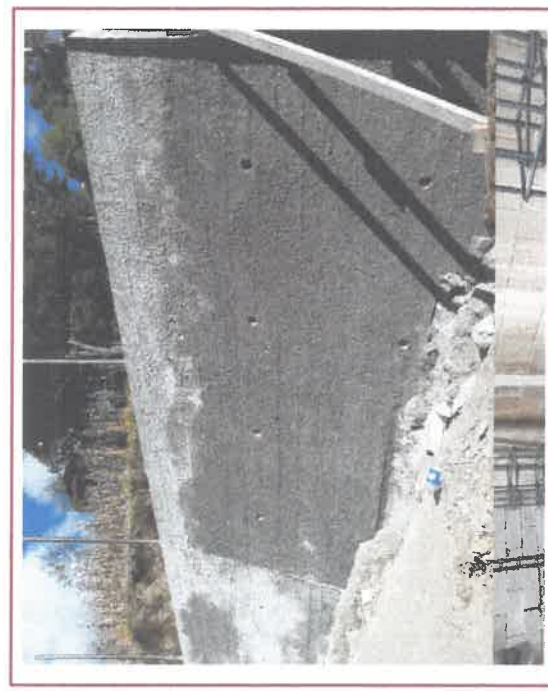

Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderigo Izquierdo Sac
Supervisor de la Municipalidad de San Francisco El Alto, Tonicapán





DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO AL 100%



PROYECTO:

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA

PARAJE CHIUTUY, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.

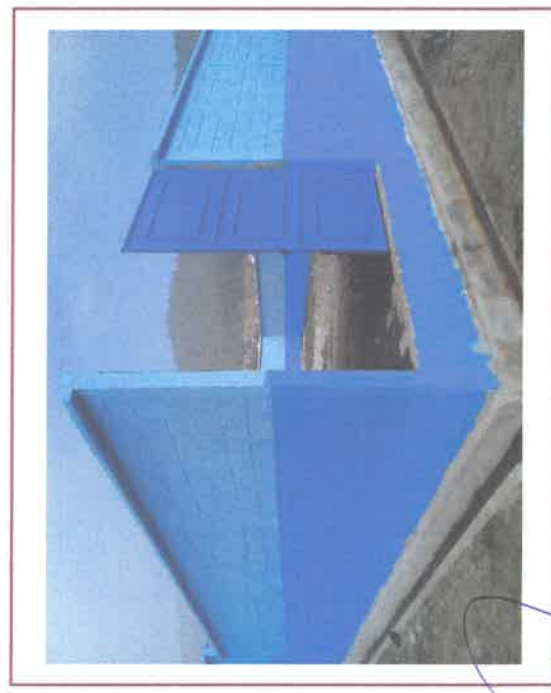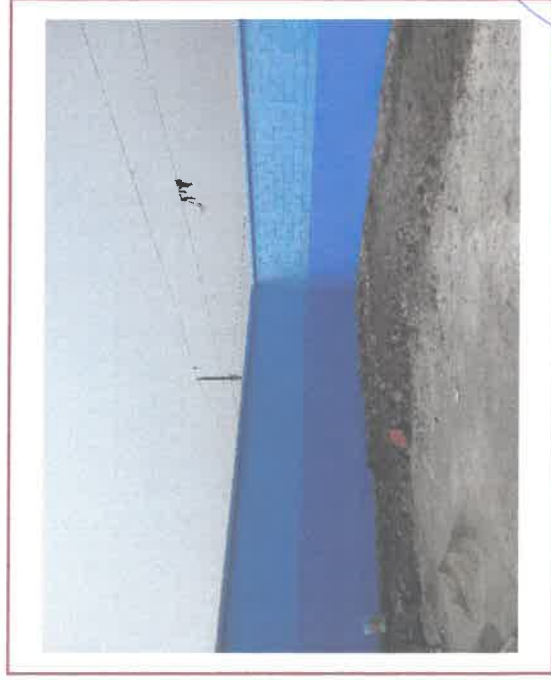

Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
 Colegiado 3,125

SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO AL 100%



PROYECTO:

AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CENTRO
ALDEA SACMIXIT
SAN FRANCISCO EL ALTO - TOTONICAPÁN



[Handwritten signature]
ARQ. FELIPE RODERICO ITZEP SAC
SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD

Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán.






DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO AL 100%



PROYECTO:

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

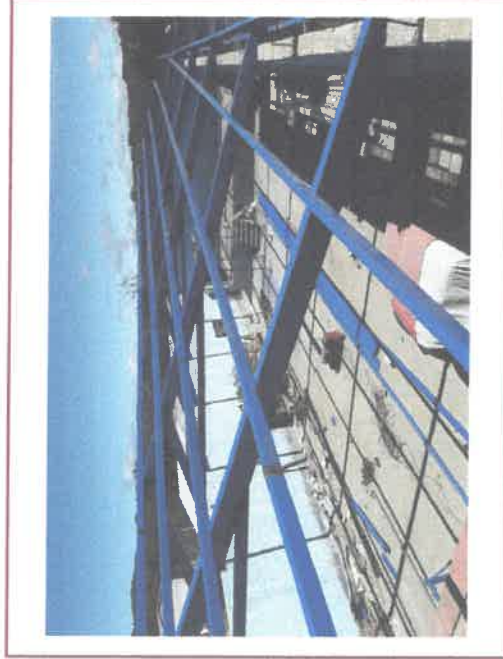


 Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
 Colegiado 3.125
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán



ARQ. FELIPE RODERICO ITZEP SAC
 SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO 100%



PROYECTO:

INFORME FOTOGRAFICO

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NUFED 380 PARAJE CHINIMABE, ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.





ARQ. FELIPE RODERICO ITZEP SAC
SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD



Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán
Dirección Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
Colegiado 3.125








DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO 100%




PROYECTO:

**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION),
 BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONTOCAPAN**

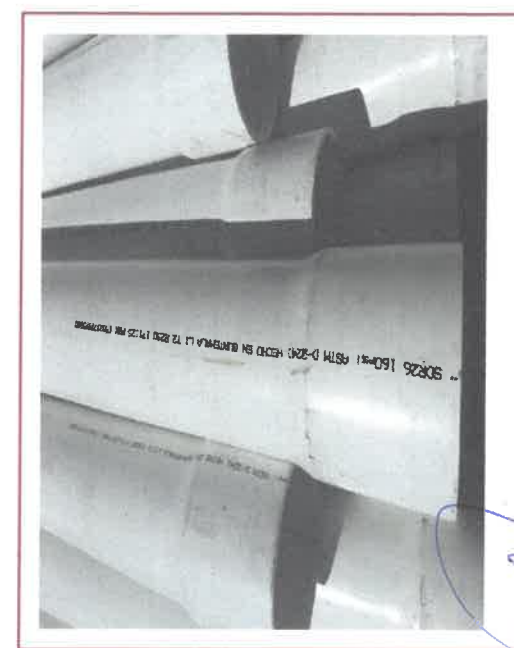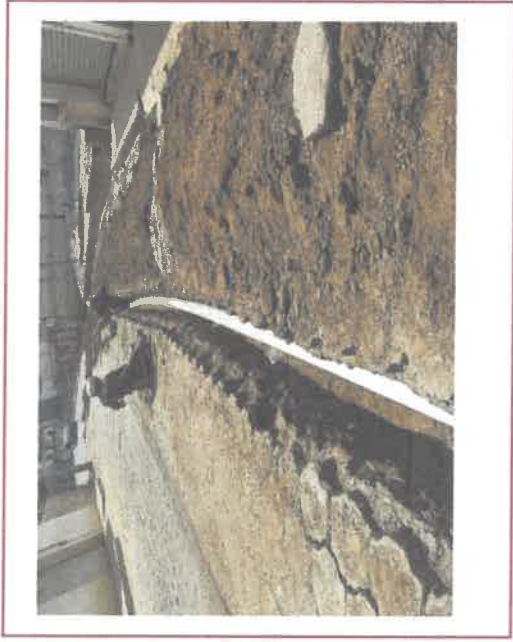


 Director Municipal de Planificación
 Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
 Calle 3, 125
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán


 F.
 ARQ. FELIPE RODERICO ITZEP-SAC
 SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD





DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO AL 100%



PROYECTO:

MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ESCUELA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPÁN.

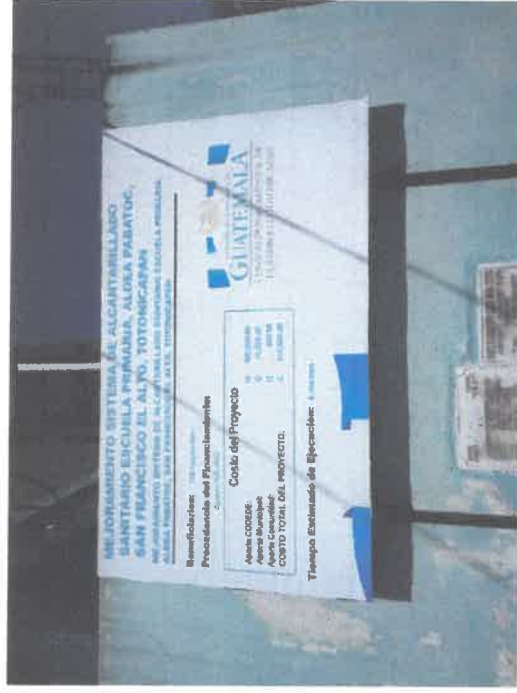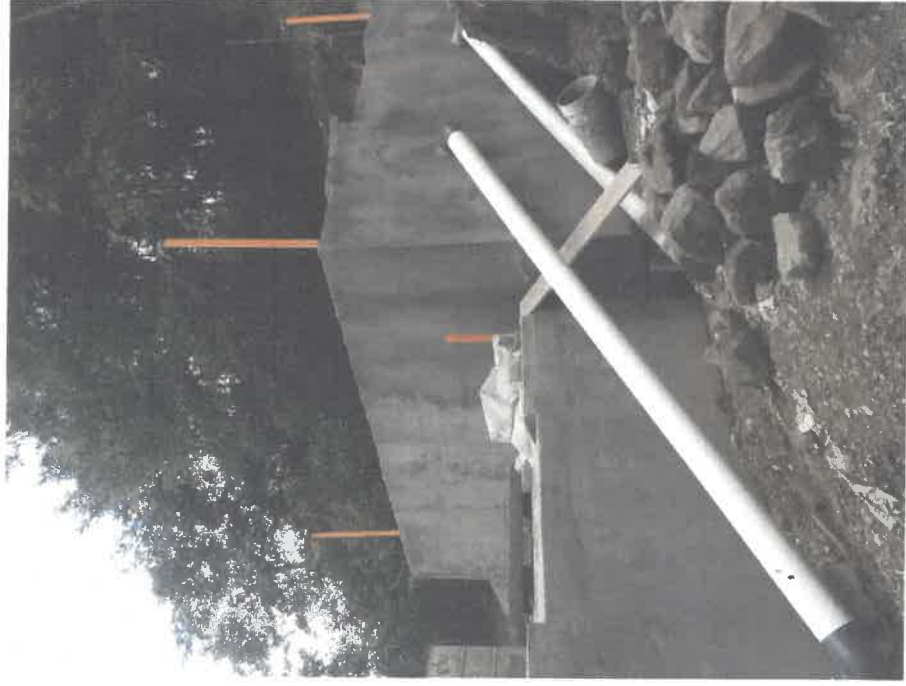

**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO
 SANITARIO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA PABATOC,
 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN**
 DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA
 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN

Beneficiarios:

Presupuesto del Proyecto:

Costo del Proyecto

Área Cobierta:

Área Construida:

Área Construida:

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

Costo Total del Proyecto:

Costo Total del Proyecto:

Costo Total del Proyecto:

Costo Total del Proyecto:

Costo Total del Proyecto:

Costo Total del Proyecto:

Costo Total del Proyecto:

Tiempo Estimado de Ejecución: 18 meses


Dirección Municipal de Planificación - Totoncapán
San Francisco El Alto
Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
Colegiado 3,125
Municipalidad de San Francisco El Alto, Totoncapán

ARQ. FELIPE RODERICO ITZEP SAC
SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD




DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de San Francisco El Alto
INFORME AVANCE FISICO AL 100%



PROYECTO:

CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO ZONA 1,2 Y 3 DEL BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN

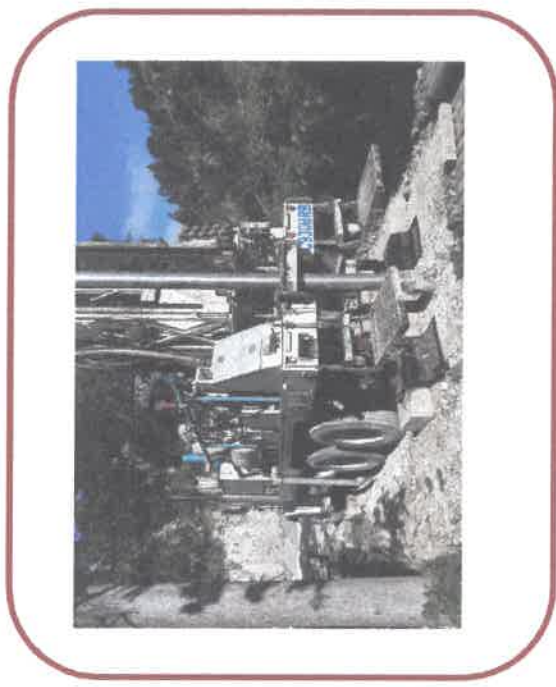

[Handwritten signature]



Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán

ARQ. FELIPE RÓDERICO ITZEP SAC
SUPERVISOR DE LA MUNICIPALIDAD



ANEXO No.2
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
 REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
 (Cifras expresadas en quetzales)

No.	CODIGO SNI-P	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	No. DE CONVENIO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	APORTES			MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIO 2018	AVANCE FINANCIERO ACUMULADA AL 31 DE OCTUBRE 2018		% DE AVANCE FISICO AL 31 DE OCTUBRE 2018
										MUNICIPALIDAD	CODEE	COMUNIDAD				TOTAL	VALOR	
1	206175	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	57-2018	06-2018	01/10/2018	CODEE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	09/10/2018	-	Q. 5,000.00	Q. 300,000.00	Q. 562.00	Q. 305,662.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%	40.00%
2	206214	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO XOLIVUP, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	58-2018	07-2018	01/10/2018	CODEE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	09/10/2018	-	Q. 10,000.00	Q. 500,000.00	Q. 763.00	Q. 510,763.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%	40.00%
3	206242	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	62-2018	08-2018	01/10/2018	CODEE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	RONALDO ELEUTERIO TIU CUA	10/10/2018	-	Q. 10,000.00	Q. 400,000.00	Q. 600.00	Q. 410,600.00	Q. -	Q. 82,120.00	Q. 82,120.00	20.00%	35.00%
4	206186	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLUA, ALDEA TACAIAVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	60-2018	09-2018	17/10/2018	CODEE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	JUAN ANTONIO CASTILLO MINERA	19/10/2018	-	Q. 8,900.00	Q. 500,000.00	Q. 100.00	Q. 509,000.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%	30.00%
5	206171	AMPLIACION INSTITUTO BASICO SECTOR EL CENTRO ALDEA SAGUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	61-2018	10-2018	17/10/2018	CODEE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	FLORDIA AMARILIS MENDOZA GONZALEZ	18/10/2018	-	Q. 9,900.00	Q. 400,000.00	Q. 100.00	Q. 410,000.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%	18.00%
6	206187	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHINIMABE, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	65-2018	11-2018	18/10/2018	CODEE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ANGEL EMANUEL MARTINEZ JUAREZ	24/10/2018	-	Q. 9,900.00	Q. 500,000.00	Q. 100.00	Q. 510,000.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%	13.00%
7	206244	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA SACMIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	68-2018	12-2018	18/10/2018	CODEE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	IRAN PABLO CAMPO SALAS	24/10/2018	-	Q. 10,000.00	Q. 800,000.00	Q. 600.00	Q. 810,600.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%	70.00%
8	206206	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARA LAS CHONIMACORRAL, CHOCRUZ II, CHOXCACOL Y PATZOLOJCHE, ALDEA SAN ANTONIO SIA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	69-2018	13-2018	19/10/2018	CODEE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	23/10/2018	-	Q. 10,000.00	Q. 600,000.00	Q. 440.00	Q. 610,440.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%	18.00%
9	206181	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA PAXXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	85-2018	14-2018	19/10/2018	CODEE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	23/10/2018	-	Q. 10,000.00	Q. 500,000.00	Q. 500.00	Q. 510,500.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%	15.00%
10	206176	AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	67-2018	15-2018	19/10/2018	CODEE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	RONALDO ELEUTERIO TIU CUA	24/10/2018	-	Q. 5,000.00	Q. 300,000.00	Q. 400.00	Q. 305,400.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%	20.00%
11	206209	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XECORRAL, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	79-2018	16-2018	19/10/2018	CODEE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ARNOLDO POJOY LOPEZ	24/10/2018	-	Q. 8,000.00	Q. 600,000.00	Q. 891.00	Q. 608,891.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%	18.00%
12	206245	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CHUCALUJUEI BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	66-2018	17-2018	24/10/2018	CODEE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS AJOPO JUAREZ	25/10/2018	-	Q. 8,000.00	Q. 750,000.00	Q. 500.00	Q. 758,500.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%	15.00%
13	225695	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA TACAIAVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	59-2018	18-2018	24/10/2018	CODEE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	25/10/2018	-	Q. 9,000.00	Q. 1,004,144.00	Q. 856.00	Q. 1,014,000.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%	20.00%

1,825
Guatemala, C.

Director Municipal de Planificación
 Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
 Colegiado 3,125
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán



E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
 www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603

Pueblo y Municipalidad de San Francisco El Alto



1,825 A.
Guatemala, C. A.

ANEXO No.3
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN
REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras expresadas en quetzales)

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIO 2018	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018		% DE AVANCE FISICO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
												VALOR	%	
1	213830	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 3ERA. CALLE ZONA 2, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	02-2018	30/08/2018	MUNICIPALIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	13/09/2018	-	Q 1,286,600.00	Q -	Q 1,029,280.00	Q 1,029,280.00	75.00%	75.00%
2	196333	AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 380, PARAJE CHINIMABE, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	01-2018	09/08/2018	MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AJPOP JUAREZ	31/08/2018	-	Q 675,500.00	Q -	Q 135,100.00	Q 135,100.00	20.00%	60.00%
3	221099	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2018, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	03-2018	07/09/2018	MUNICIPALIDAD	RENE ANIBAL SONTAY SICA	01/10/2018	02/10/2018	Q 297,000.00	Q -	Q 297,000.00	Q 297,000.00	100.00%	100.00%
4	213747	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALCANDIA COMUNITARIA, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	04-2018	11/09/2018	MUNICIPALIDAD	JOSE MAX CHOJOLAN TURNIL	28/09/2018	-	Q 557,900.00	Q -	Q 446,320.00	Q 446,320.00	75.00%	75.00%
5	213832	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHO, PAVIMENTO DE PATIO Y CIRCULACION), PARAJE CHICOJ, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	05-2018	11/09/2018	MUNICIPALIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	26/09/2018	-	Q 208,000.00	Q -	Q 158,080.00	Q 158,080.00	70.00%	70.00%

[Handwritten signature]
Arq. FELIPE RODERICO ITZEP SAC
DIRECTOR DMP

 Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
Colegiado 3,125
Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán



















Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603




















MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS AÑO 2018
AVANCES ESTIMADOS A LA FECHA 08-11-2018.
PROYECTOS CODEDE Y MUNICIPALES.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD	OBSERVACIONES EN VISITAS	OBSERVACIONES EN VISITAS	FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	% AVANCE FÍSICO ESTIMADO A LA FECHA
1	206175	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	CODEDE	Medición de longitud de muro de circulación frontal.	Verificación de armado de muro de contención, verificación de zona a pavimentar. Supervisión conjunta Sup. De Consejo de Desarrollo.				40.00%
2	206176	AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	CODEDE	Verificación del trazo y trabajos preliminares. Supervisión conjunta con Sup. De Consejo de Desarrollo.	Excaavción, armado de columnas y zapatas, fundición de cemento corrido y levantado de muro de cimentación.				20.00%
3	206214	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO XOLJUUP, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	CODEDE	Verificación de trabajos de cimentación, recomendaciones sobre armado de columnas.	Medición de m2 de levantado de pared, recomendaciones sobre acondicionamiento del talud. Supervisión conjunta con Sup. De Consejo de Desarrollo.				40.00%
4	206181	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	CODEDE	Verificación de trabajos preliminares, previos al trazo de la construcción.	Excavación para cimentación de zapatas y cemento corrido.				15.00%
5	206209	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XECORRAL, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	CODEDE	Verificación del trazo y trabajos preliminares.	Verificación del armado de zapatas y armado de columnas. Recomendaciones previo a fundición de cimentación.				18.00%
6	206244	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	CODEDE	Se revisa el terreno previo a llegada de equipo para perforación.	Se realiza la perforación del pozo, con el equipo adecuado.				70.00%







Juan Gustavo Alva Rosales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 13106

7	206187	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHINIMABE , ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	CODEDE	Se observa el trazo de la construcción e inicios de la excavación.	Se verifican armados de columnas y zapatas, se verifica ancho de cemento corrido y levantado de muro de cimentación.				13.00%
8	206206	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARAJES CHONIMACORRAL, CHOCRUZ II, CHOXCACOL Y PATZOLOJCHE , ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	CODEDE	Se realiza revisión del tramo inicial, se hacen recomendaciones al encargado para realizar armado de zapatas y columnas de pasos aéreos.	Fundición de columnas de pasos aéreos.				18.00%
9	206171	AMPLIACION INSTITUTO BASICO SECTOR EL CENTRO ALDEA SAQUICOL , SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	CODEDE	Levantado de muro, armado de columnas y soleras					18.00%
10	225695	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA TACAVALVE , SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	CODEDE	Se observa el trazo e inicios de excavación para la construcción de cajas unificadoras. Supervisión conjunta con Sup. De Codede.	Se observa armado para cajas y fundición de base de cajas, Se verifica refuerzo de acero con respecto a planos.				20.00%
11	206188	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLJA , ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	CODEDE	Se realiza verificación de medidas del segundo nivel a construir, así como el módulo de gradas.					30.00%
12	206242	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO PARAJE PALEMOP , SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	CODEDE	Verificación de trabajos de demolición del concreto existente.	Verificación de armados de zapatas y columnas. Supervisión conjunta con Sup. De Consejo de Desarrollo.				35.00%
13	206245	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CHUICALQUIEJ BARRIO XOLVE , SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	CODEDE	Personal realizando la medición de la longitud del proyecto e inicios del corte de pavimento.					15.00%
1	213747	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA RANCHO DE TEJA , SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	MUNICIPAL	Fundición de columnas tipo C-2, se verifica el armado correcto, levantado de pared y fundición de soleras y columnas tipo C-6, C-7 y C-8.					75.00%



Juan Gustavo Alva Rosales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 13106

2	196333	AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO NUFED 380, PARAJE CHINIMABE, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	MUNICIPAL	Levantado de muro, armado de vigas y losa. Se verifican medicas del m modulo de gradas y baños.		60.00%
3	213549	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHICOJ A PASUC, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	MUNICIPAL	Se verifica longitud del muro de circulación, se trabaja en la estructura y armado de techo.		70.00%
4	213830	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 3ERA. CALLE ZONA 2, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	MUNICIPAL	Corte de pavimento existente, Instalación de tubería, conformación de base para pavimento nuevo y fundición de pavimento nuevo.		75.00%
5	221099	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO RED ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2018, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	MUNICIPAL	Entrega de la totalidad de 220 lámparas LED para alumbrado público.		100.00%

Ing.

Juan Gustavo Alva Rosales
Supervisor Municipal de Obras
Municipalidad de San Francisco El Alto

Juan Gustavo Alva Rosales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 13106

