



Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

San Francisco El Alto, lunes, 13 de enero de 2020
Oficio No. 016-2020
Ref. DMP

A: César Miguel Ajpop Zapeta
Unidad de Información Pública Municipal

Por medio de la presente se le hace entrega de la información requerida según Circular No. 01-2020. UIPM de fecha 09 de Enero del presente año 2020, la cual van adjuntas al presente oficio:

Sin nada más que agregar, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,


Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
Colegiado 3, 125
Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán



Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

MISION

Somos una Institución de Gobierno Municipal que Impulsa el desarrollo integral, equitativo y sostenible del Municipio, a través de la recaudación, cooperación, gestión y administración del patrimonio municipal y los servicios públicos de manera eficaz, con una evaluación permanente, promoviendo la organización y participación activa y voluntaria de la población organizada en el Municipio en busca del bien común y la conservación y gestión integrada de los recursos naturales del territorio.

OBJETIVO

Brindar a la población personal para la seguridad, ordenamiento, ornato en el municipio, además del personal para atención al medio ambiente.



Director Municipal de Planificación
Arg. Felipe Roderico Itzep Sac
Colegiado 3,125
Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán

Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

1,825
Guatemala, G.A.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	MONTO DEL CONTRATO	ESTIMADO DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS ANTERIORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		%	% DE AVANCE FISICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
												VALOR	VALOR		
1	230212	DOTACION DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE VARIAS COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	12-2019	17/05/2019	MUNICIPALIDAD	LUCIA FRANCISCA CRUZ RAMIREZ DE HERNANDEZ	23/05/2019	27/05/2019	Q. 324,972.00	Q. -	Q. 324,972.00	Q. 324,972.00	100.00%	100.00%	
2	235445	DOTACION DE MATERIALES PARA CALLE Y CAMINO VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	14-2019	01/06/2019	MUNICIPALIDAD	ROSALBA PASTOR CHANAX	14/06/2019	14/06/2019	Q. 1,125,000.00	Q. -	Q. 1,125,000.00	Q. 1,125,000.00	100.00%	100.00%	
3	213560	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CANTONCOK, PARAJE PAMAMAN CHUL, ALDEA CHIRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	10-2019	25/04/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	14/05/2019	08/07/2019	Q. 335,500.00	Q. -	Q. 335,500.00	Q. 335,500.00	100.00%	100.00%	
4	230105	AMPLIACION DE TERRENO PARA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	11-2019	25/04/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE MAX CHIOLOAN TURNIL	14/05/2019	11/09/2019	Q. 558,525.00	Q. -	Q. 446,500.00	Q. 446,500.00	95.00%	100.00%	
5	-	COMPRAS DE LAMPARAS TIPO LED PARA EL PROYECTO DE CONSERVACION DE RED DE ALIMENTACION PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	13-2019	04/06/2019	MUNICIPALIDAD	JANINE AURELIANO AGUILAR MATEIAS	28/06/2019	28/06/2019	Q. 480,000.00	Q. -	Q. 480,000.00	Q. 480,000.00	100.00%	100.00%	
6	230106	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CANTONCOK, PARAJE PALMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	31-2019	15/11/2019	MUNICIPALIDAD	RAMON ANIBAL HERNANDEZ OSORIO	28/11/2019	-	Q. 325,000.00	Q. -	Q. 65,000.00	Q. 292,500.00	90.00%	100.00%	
7	230436	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, PARAJE CHILMOR, ALDEA TACALAVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	32-2019	15/11/2019	MUNICIPALIDAD	ARNOLDO POJOY LOPEZ	28/11/2019	26/12/2019	Q. 435,560.75	Q. -	Q. 435,560.75	Q. 435,560.75	100.00%	100.00%	
8	230435	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, SECTOR CEMENTERO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	33-2019	15/11/2019	MUNICIPALIDAD	MARLON REBE ARQUELTA ESCOBAR	28/11/2019	20/02/2019	Q. 325,000.00	Q. -	Q. 325,000.00	Q. 325,000.00	100.00%	100.00%	
9	230433	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, PARAJE PASTAY, ALDEA PAKAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	34-2019	25/11/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	02/12/2019	30/12/2019	Q. 435,500.00	Q. -	Q. 348,400.00	Q. 348,400.00	80.00%	100.00%	
10	230113	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL, ALDEA (INTERCANTON DE PANTO), ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	35-2019	25/11/2019	MUNICIPALIDAD	MARLON REBE ARQUELTA ESCOBAR	03/12/2019	-	Q. 559,000.00	Q. -	Q. 325,400.00	Q. 325,400.00	60.00%	100.00%	
11	231296	AMPLIACION DE BARRIO (S) ALCALDIA COMUNITARIA SEQUINDO RIVER, BARRIO CHUSIGUAN ENTRE LA SEGUNDA CALLE Y TERCERA AVENIDA DE LA ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	36-2018	24/11/2019	MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AIPOPUJAREZ	11/12/2019	-	Q. 559,050.00	Q. -	Q. 111,890.00	Q. 111,890.00	20.00%	55.00%	
12	230102	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, PARAJE CHICOL A PASO FASE II, BARRIO MOLTE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	37-2019	06/12/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	16/12/2019	30/12/2019	Q. 511,000.00	Q. -	Q. 102,200.00	Q. 102,200.00	20.00%	100.00%	
13	230116	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, PARAJE CHOTZAMBAL, CHISAC, ALDEA SAN ANTONIO SIA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	38-2019	06/12/2019	MUNICIPALIDAD	CARLOS ESTUARDO LOPEZ VASQUEZ	16/12/2019	-	Q. 559,000.00	Q. -	Q. 531,050.00	Q. 531,050.00	95.00%	100.00%	
13	230114	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, PARAJE CENTRAL, PARAJE CHIRI-CRUZ, ALDEA CHIRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	39-2019	06/12/2019	MUNICIPALIDAD	CARLOS ESTUARDO LOPEZ VASQUEZ	16/12/2019	-	Q. 435,500.00	Q. -	Q. 531,050.00	Q. 531,050.00	95.00%	100.00%	

ANEXO No. 2
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en quetzales)

Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com

www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

15	230110	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUICHAL, ALDEA PACHAL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	40-2019	13/12/2019	MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AÍPOPUJAREZ	17/12/2019	-	Q. 435,500.00	Q. -	Q. 413,725.00	Q. 413,725.00	95.00%	95.00%
16	230434	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ENTRADA PRINCIPAL, PARAJE CHIKUAK, ALDEA PARATOC SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	41-2019	13/12/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE ESTUARDO HERRERA NORIEGA	17/12/2019	-	Q. 325,000.00	Q. -	Q. 308,750.00	Q. 308,750.00	95.00%	100.00%
17	230108	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL HACIA KESIC, ALDEA SACCHIMUT SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	42-2019	13/12/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE ESTUARDO HERRERA NORIEGA	17/12/2019	30/12/2019	Q. 325,000.00	Q. -	Q. 308,750.00	Q. 308,750.00	95.00%	100.00%
18	214323	MEJORAMIENTO CALLE 3ERA CALLE ENTRE 1ERA AVENIDA Y 5TA CALLE DE LA ZONA 2 BARRIO CHUSIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	43-2019	27/12/2019	MUNICIPALIDAD	URRABO BONIFACIO OCHOA LOPEZ	03/01/2020	-	Q. 850,000.00	Q. -	Q. 170,000.00	Q. 170,000.00	20.00%	10.00%

f. 
ARQ. FELIPE RODERICO ITZEP SAC
 DIRECTOR DMP


 Municipio de San Francisco El Alto, Totonicapán
 Colegiado 3.1.25

VoBo f. 
ANTONIO ALVAREZ MALDONADO
 ALCALDE MUNICIPAL



Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

ANEXO No. 1
 REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FIANCAMIENTO
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (CATEGORIA DE EJECUCION)

No	CONGO SNP	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	APORTES		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TOTAL	ERRORES DEPENDIENDO DE ANTERIORES 2019	ERRORES DEPENDIENDO DE 31 DE DICIEMBRE DE 2019	AVANCE FINANCIERO		%	% DE AVANCE FISICAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
										COMUNAL	MUNICIPAL					VALOR	VALOR			
1	224333	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRENOK, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	53-2019	15-2019	29/09/2019	CONTRATO	ANGEL RAFAEL MARTINEZ JUAREZ	17/09/2019	-	-	C\$500,000.00	C\$500,000.00	C\$500,000.00	C\$500,000.00	0	0	C\$500,000.00	C\$500,000.00	100.00%	100.00%
2	224409	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR EL CENTRO DEL PUEBLO, ALDEA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	54-2019	15-2019	20/09/2019	CONTRATO	KEVIN HARRIS GARCIA HERRERA	27/09/2019	-	-	C\$400,000.00	C\$500,000.00	C\$900,000.00	C\$400,000.00	0	0	C\$397,488.00	C\$397,488.00	98.00%	98.00%
3	224290	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE LOS PINALES, ALDEA SAN ANTONIO SIA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	55-2019	17-2019	29/09/2019	CONTRATO	EDDY USABINO LUCAS LOPEZ	17/09/2019	02/12/2019	-	C\$800,000.00	C\$5,000.00	C\$805,000.00	C\$805,750.00	0	0	C\$805,750.00	C\$805,750.00	100.00%	100.00%
4	224226	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, PARAJE CHOLU, ALDEA PAXULIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	56-2019	16-2019	06/09/2019	CONTRATO	KEVIN HARRIS GARCIA HERRERA	27/09/2019	-	-	C\$300,000.00	C\$5,000.00	C\$305,000.00	C\$305,520.00	0	0	C\$305,520.00	C\$305,520.00	100.00%	100.00%
5	224234	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR UJENEA DE CONDUCCION, BARRO, ALDEA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	57-2019	19-2019	06/09/2019	CONTRATO	EDDY USABINO LUCAS LOPEZ	27/09/2019	22/12/2019	-	C\$750,000.00	C\$5,000.00	C\$755,000.00	C\$755,711.00	0	0	C\$755,711.00	C\$755,711.00	100.00%	100.00%
6	224229	AMPLIACION INSTITUTO BASICO, SECTOR PABAL, PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	60-2019	20-2019	06/09/2019	CONTRATO	JOSE ESTUARDO HERRERA MONTAÑA	27/09/2019	30/12/2019	-	C\$300,000.00	C\$2,500.00	C\$302,500.00	C\$303,000.00	0	0	C\$303,000.00	C\$303,000.00	100.00%	100.00%
7	224236	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHICHU, ALDEA PACHA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	58-2019	22-2019	10/09/2019	CONTRATO	JUAN RAMOS HERRERA	27/09/2019	02/12/2019	-	C\$500,000.00	C\$5,000.00	C\$505,000.00	C\$505,575.00	0	0	C\$505,575.00	C\$505,575.00	100.00%	100.00%
8	224410	MEJORAMIENTO PUERTO DE SALUD, PRESAL, SECTOR EL ALTO, TOTONICAPAN	59-2019	23-2019	10/09/2019	CONTRATO	KEVIN HARRIS GARCIA HERRERA	27/09/2019	-	-	C\$400,000.00	C\$5,000.00	C\$405,000.00	C\$405,545.00	0	0	C\$405,545.00	C\$405,545.00	100.00%	100.00%
9	224499	TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARAJE CHONIMACHORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	72-2019	30-2019	23/10/2019	CONTRATO	ALBERTO NICOLAS AYOB AMARZ	25/12/2019	-	-	C\$1,341,855.00	C\$547.00	C\$1,342,500.00	C\$1,342,500.00	0	0	C\$1,342,500.00	C\$1,342,500.00	100.00%	100.00%
10	224343	CONSTRUCCION POZOS (ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN)	68-2019	23-2019	26/09/2019	CONTRATO	EDDY USABINO LUCAS LOPEZ	08/10/2019	-	-	C\$800,000.00	C\$4,805.00	C\$804,805.00	C\$805,805.00	0	0	C\$805,805.00	C\$805,805.00	100.00%	100.00%
11	224437	CONSTRUCCION PUERTO DE SALUD, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	69-2019	24-2019	26/09/2019	CONTRATO	MIGUEL JIMENEZ	09/10/2019	-	-	C\$400,000.00	C\$5,000.00	C\$405,000.00	C\$405,722.00	0	0	C\$405,722.00	C\$405,722.00	100.00%	100.00%
12	224428	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHIVARETO, ALDEA CHIVARETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	70-2019	25-2019	27/09/2019	CONTRATO	ALBERTO NICOLAS AYOB AMARZ	30/10/2019	08/12/2019	-	C\$300,000.00	C\$1,700.00	C\$301,700.00	C\$301,800.00	0	0	C\$301,800.00	C\$301,800.00	100.00%	100.00%
13	224278	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, 20 DE OCTUBRE, CENTRO ALDEA TACAALIVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	26-2019	26-2019	27/09/2019	CONTRATO	ROLDANO OLIVEROS TIJOLA	09/10/2019	-	-	C\$500,000.00	C\$5,000.00	C\$505,000.00	C\$505,800.00	0	0	C\$505,800.00	C\$505,800.00	100.00%	100.00%
14	224328	CONSTRUCCION PUERTO DE SALUD, CENTRO ALDEA SAKOKIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	74-2019	27-2019	27/09/2019	CONTRATO	NACIONAL ANGELIA ESCOBAR	09/10/2019	-	-	C\$400,000.00	C\$5,000.00	C\$405,000.00	C\$405,500.00	0	0	C\$405,500.00	C\$405,500.00	100.00%	100.00%
15	224235	AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COPIER, CENTRO ALDEA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	75-2019	28-2019	02/10/2019	CONTRATO	EDDY USABINO LUCAS LOPEZ	08/10/2019	02/12/2019	-	C\$750,000.00	C\$5,000.00	C\$755,000.00	C\$755,512.00	0	0	C\$755,512.00	C\$755,512.00	100.00%	100.00%
16	224232	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (4500 METROS CUADROS), PARAJE PATZUTZITZ, BARRO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	71-2019	29-2019	02/10/2019	CONTRATO	ALBERTO NICOLAS AYOB AMARZ	10/10/2019	03/12/2019	-	C\$262,787.00	C\$4,833.00	C\$267,620.00	C\$267,500.00	0	0	C\$267,500.00	C\$267,500.00	100.00%	100.00%

Yo, Sr. **Arq. Felipe Roberto Lopez Barrios**, Director DMP, Director Municipal de Planificacion Colegiado 3.125, en nombre de la Municipalidad de San Francisco El Alto, Tonicapán, Guatemala, C.A., certifico que los datos aquí consignados son verídicos y corresponden a la realidad.

Yo, Sr. **Antonio Alvarez Maldonado**, Alcalde Municipal, certifico que los datos aquí consignados son verídicos y corresponden a la realidad.



Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto




E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE
AÑO 2019.**

1. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS CODEDE AÑO 2019





Se informa la supervisión de los trabajos realizados y el avance físico estimado para el mes de diciembre.

1	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se supervisan trabajos finales, instalación de puertas y ventanas, pintura y limpieza final. Proyecto finalizado en un 100%. Proyecto recepcionado.	
2	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE LOS PINALES, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se supervisan trabajos finales, instalación de puertas y ventanas, pintura, suministro de mobiliario, porcentaje de avande del 100%. Se procede con la recepción del proyecto.	
3	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se supervisan trabajos de Instalacion de Tuberia HG 1 1/2" 500 PSI y Construccion Paso de Zanjon de 6.50 ml, así mismo, construccion Columna de Paso aereo de 30.00 ml. Se tiene un avance del 98%.	


 Director Municipal de Planificación
 ATQ. JUAN ROBERTO JIJO SAC
 Colegiado 3,425
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán







"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

4	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, PARAJE CHUQUI, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Se supervisan trabajos de tallado, cernido y granceado de losa, así mismo tallado y alisado de vigas, columnas y soleras. Avance físico del 82%.	
5	AMPLIACION INSTITUTO BASICO, SECTOR PABAJ, PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Se supervisan trabajos de instalación de puertas y ventanas, aplicación de pintura y limpieza final. El proyecto se encuentra concluido en un 100%, se procede a la recepción del mismo.	
6	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Se supervisan trabajos finales de piso de granito, segundo nivel, instalación de puertas y ventanas y vidrios, suministro de mobiliario. Proyecto finalizado en un 100%, proyecto recepcionado.	
7	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, PARAJE PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Se supervisan trabajos de armado y fundición de columnas, armado y fundición de soleras, levantado de pared y trabajos de instalación del techo de estructura metálica. Proyecto con un avance físico del 95%.	

Dirección Municipal de Planificación
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Tonicapán
 Colegiado 3.125



"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

8	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, SECTOR CHITOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se realiza supervisión del aforo del pozo, prueba de bombeo de 24 horas. La producción preliminar del pozo es de 260 GPM, se queda en espera de las pruebas de laboratorio de las muestras de agua. Avance físico del proyecto del 99%.	
9	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se supervisan trabajos de curado de losa, así se observa la aplicación de monocapa e instalación de piso granito. Se tiene un avance físico del 78%.	
10	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHIVENTUR, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se supervisan trabajos finales de instalaciones electricas de iluminación y limpieza final. Se tiene un avance físico del 100%, proyecto recepcionado.	
11	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, 20 DE OCTUBRE, CENTRO ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se supervisan trabajos finales de aplicación de pintura en muros y losa, suministro de pupitres y escritorios e instalación de ventanas y vidrios Porcentaje de avance del 100%, se procede con la recepción del proyecto.	

Director Municipal de Planificación
 Rolando Riquelme Lopez Sac
 Calle 3.125
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Tonicapán



"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

12	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se realiza supervisión de trabajos finales de instalación de puertas de metal y prefabricadas, así mismo suministro de escritorios y camillas, porcentaje de avance del 100%, se procede con la recepción del proyecto.	
13	AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IMEB, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se supervisan trabajos finales de instalaciones eléctricas de iluminación, así como limpieza final. Proyecto con avance físico del 100%, proyecto recepcionado.	
14	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDO NIVEL), PARAJE PATZUTZUTZ, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se supervisan trabajos finales de repello, pintura e instalaciones eléctricas, así mismo limpieza final, proyecto con avance físico del 100%, se recepciona el proyecto.	
15	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se verifican trabajos de fundición de tanques Imhoff se tienen 2 tanques concluidos, el avance físico del proyecto es del 54 %.	




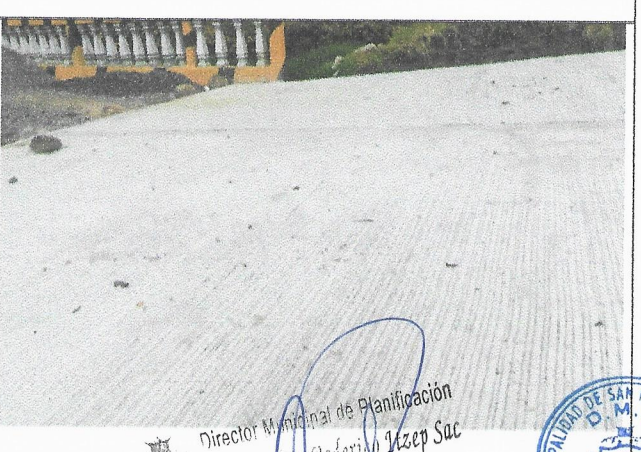
Dirección Municipal de Planificación
 Lic. Asierro Lizco Sac
 Registrado 125
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán



"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

1. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES AÑO 2019

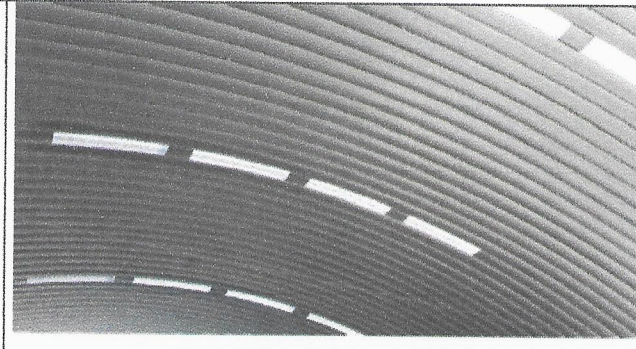

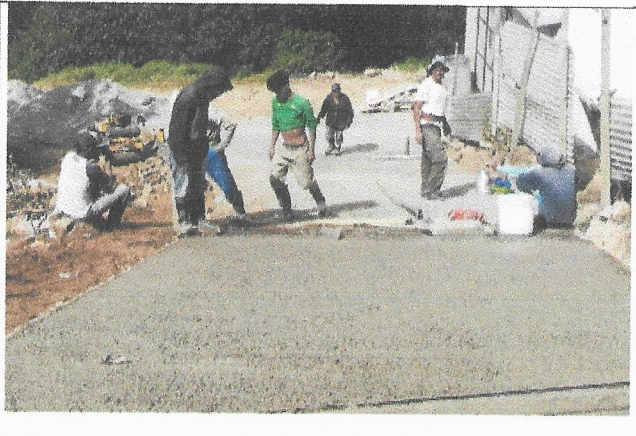

Se informa la supervisión de los trabajos realizados y el avance físico estimado para el mes de diciembre.

1	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) SALON DE USOS MULTIPLES ALCALDIA COMUNITARIA, PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	Se supervisan trabajos de fundición de columnas, se realiza medición de todos los trabajos contratados, por lo que al haber algunas diferencias, se procede con la realización de una orden de cambio. Se concluye el proyecto en un 100% se recepciona el proyecto.	
2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-LIMOB, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	Se supervisan trabajos fundición de pavimento, curado, corte y sello de pavimento, el proyecto se concluye en un 100%. Proyecto recepcionado.	
3	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CEMENTERIO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	Se supervisan trabajos de fundición de pavimento, corte y sello de juntas, así como fundición de bordillos. Proyecto finalizao en un 100%, se recepciona el mismo.	
4	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASTAY, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	Se supervisan trabajos de corte y nivelación del terreno, tendido y compactación de base y fundición de bordillos y pavimento. Así mismo, corte y sello de juntas. Se tiene un avance físico del 100%, se procede con la recepción del proyecto.	

Director Municipal de Planificación
 Arq. Jairo Rodolfo Itzep Sac
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán




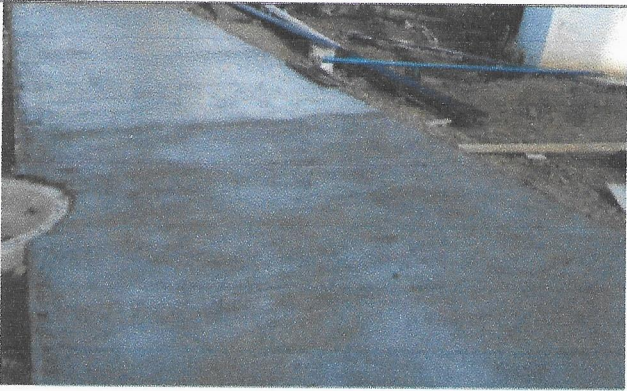
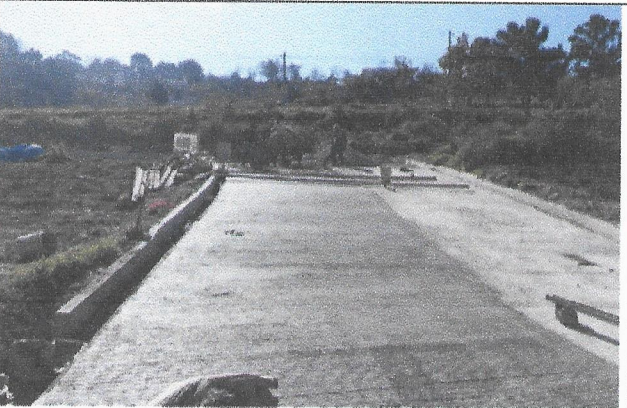

"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"


5	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, (ENTECHADO DE PATIO), CENTRO ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN.	Se supervisan trabajos de excavación y fundición de zapatas, armado y fundición de columnas, reposición de piso, así mismo soportes e instalaciones eléctricas. Proyecto concluido en un 100%.	
6	AMPLIACION EDIFICIO (S) ALCALDIA COMUNITARIA SEGUNDO NIVEL, BARRIO CHUIGUAN ENTRE LA SEGUNDA CALLE Y TERCERA AVENIDA DE LA ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN.	Se supervisa armado longitudinal y transversal de las columnas tipo A, lo cual cumple con la planificación, así mismo se realizan recomendaciones para la fundición de las mismas. Se tiene un avance físico del 50%.	
7	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHICOJ A PASUC FASE II, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN.	Se supervisan trabajos de corte y nivelación del terreno, tendido y compactación de base y fundición de bordillos y pavimento. Se tiene un avance físico del 95%.	
8	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHOTZAMBAL CHISAC, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN.	Se supervisan trabajos de corte y nivelación del terreno, tendido y compactación de base y fundición de bordillos y pavimento. Se tiene un avance físico del 95%.	



 Dirección Municipal de Planificación
 Arq. Yvelina Rosales Pérez Sac
 Colegiado 3,125
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán



"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

9	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHIRIJ-CRUZ, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	Se supervisan trabajos de corte y nivelación del terreno, tendido y compactación de base y fundición de bordillos y pavimento. Se tiene un avance físico del 95%.	
10	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	Se supervisan trabajos de corte y nivelación del terreno, tendido y compactación de base y fundición de bordillos y pavimento. Se tiene un avance físico del 95%.	
11	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ENTRADA PRINCIPAL, PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	Se supervisan trabajos de corte y nivelación del terreno, tendido y compactación de base y fundición de bordillos y pavimento. Se tiene un avance físico del 95%.	
12	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL HACIA XESUC, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	Se supervisan trabajos de corte y nivelación del terreno, tendido y compactación de base y fundición de bordillos y pavimento. Se tiene un avance físico del 95%.	


 Director Municipal de Planificación
 Calle Guatemala 8, 125
 Totonicapán, Totonicapán


Juan Gustavo Alva Rosales
 INGENIERO CIVIL
 COLEGIADO No. 13106
 Ing. Juan Gustavo Alva Rosales
 Supervisor Municipal de Obras
 San Francisco El Alto, Totonicapán.

