


San Francisco El Alto, martes, 03 de marzo de 2020
Oficio No. 083-2020
Ref. DMP


A: César Miguel Ajpop Zapeta
Unidad de Información Pública Municipal

Por medio de la presente se le hace entrega de la información requerida según Circular No. 04-2020. UIPM de fecha 26 de febrero del presente año 2020, correspondiente al periodo 01 al 29 de febrero de 2020, cual van adjuntas al presente oficio.

Sin nada más que agregar, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,





Ing. Edgar Manolo Arnoldo Calderón Mazariegos
Director Municipal de Planificación

MISION

Somos una Institución de Gobierno Municipal que Impulsa el desarrollo integral, equitativo y sostenible del Municipio, a través de la recaudación, cooperación, gestión y administración del patrimonio municipal y los servicios públicos de manera eficaz, con una evaluación permanente, promoviendo la organización y participación activa y voluntaria de la población organizada en el Municipio en busca del bien común y la conservación y gestión integrada de los recursos naturales del territorio.

OBJETIVO

Brindar a la población personal para la seguridad, ordenamiento, ornato en el municipio, además del personal para atención al medio ambiente.




Ing. Edgar Manolo Arnoldo Calderón Mazariegos
Director Municipal de Planificación

ANEXO No.1
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TONONICAPÁN
REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(cifras expresadas en quetzales)

No.	Codigo SNI	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	No. DE CONVENIO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	APORTES		MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DE OBRAS DE BIENES ANTERIORES 2019	EJECUCION DEVENGADA AL 29 DE FEBRERO DE 2020	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		% DE AVANCE FISICO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
										COBIDE	MUNICIPALIDAD				VALOR	%	
1	224333	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARA EL PAISAJE ALDEA SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	53-2019	15-2019	29/08/2019	COBIDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ANGEL EMANUEL MARTINEZ JIAREZ	17/09/2019	02/12/2019	Q500,000.00	Q5,000.00	Q505,538.00	Q 410,312.50	Q 410,312.50	81.16%	100.00%	
2	224409	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL CENTRO ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	54-2019	16-2019	29/08/2019	COBIDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	KEVIN JAISEM GARCIA HERRERA	27/09/2019	-	Q5,000.00	Q600.00	Q405,600.00	Q 297,000.00	Q 297,000.00	73.22%	100.00%	
3	224230	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARA EL PAISAJE ALDEA SAN ANTONIO SIA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	55-2019	17-2019	29/08/2019	COBIDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY USANDIRO LUCAS LOPEZ	17/09/2019	02/12/2019	Q5,000.00	Q750.00	Q605,750.00	Q 466,354.00	Q 605,750.00	100.00%	100.00%	
4	224226	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, PARA EL PAISAJE ALDEA PAXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	56-2019	18-2019	06/09/2019	COBIDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	KEVIN JAISEM GARCIA HERRERA	27/09/2019	-	Q5,000.00	Q520.00	Q505,520.00	Q 252,500.00	Q 441,875.00	87.11%	82.50%	
5	224234	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDO NIVEL) PARA EL CONDOMINIO BARRIO XOLUE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	57-2019	19-2019	06/09/2019	COBIDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY USANDIRO LUCAS LOPEZ	27/09/2019	22/12/2019	Q5,000.00	Q711.00	Q755,711.00	Q 755,711.00	Q 755,711.00	100.00%	100.00%	
6	224229	AMPLIACION INSTITUTO BASICO, SECTOR PABAJ, PARA EL PAISAJE ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	60-2019	20-2019	06/09/2019	COBIDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	JOSE ESTUARDO HERRERA NORIEGA	27/09/2019	30/12/2019	Q2,500.00	Q800.00	Q303,300.00	Q 124,781.25	Q 303,300.00	100.00%	100.00%	
7	224236	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARA EL PAISAJE ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	58-2019	22-2019	10/09/2019	COBIDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	JUAN RAMOS HERNANDEZ	27/09/2019	02/12/2019	Q5,000.00	Q575.00	Q505,575.00	Q 432,406.50	Q 432,406.50	85.53%	100.00%	
8	224410	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, PARA EL PAISAJE ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	59-2019	21-2019	10/09/2019	COBIDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	KEVIN JAISEM GARCIA HERRERA	27/09/2019	-	Q4,000.00	Q545.00	Q405,545.00	Q 394,275.00	Q 394,275.00	97.57%	100.00%	
9	224439	CONSTRUCCION SISTEMA DE BIENESTAR ALDEAS PARA EL PAISAJE ALDEA SAN ANTONIO SIA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	72-2019	30-2019	23/10/2019	COBIDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS APOPO JUAREZ	23/10/2019	-	Q1,341,853.00	Q100.00	Q1,342,500.00	Q 268,500.00	Q 268,500.00	20.00%	54.00%	
10	224343	CONSTRUCCION POZOS (SEGUNDO NIVEL) PARA EL PAISAJE ALDEA SANGHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	68-2019	23-2019	26/09/2019	COBIDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY USANDIRO LUCAS LOPEZ	06/10/2019	-	Q4,805.00	Q275,000.00	Q879,805.00	Q 549,428.13	Q 807,931.75	97.65%	100.00%	
11	224437	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	69-2019	24-2019	26/09/2019	COBIDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	INGELUIJUAZ SALES	06/10/2019	-	Q5,000.00	Q722.00	Q405,722.00	Q 293,574.38	Q 293,574.38	72.56%	100.00%	
12	224228	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARA EL PAISAJE ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	70-2019	25-2019	27/09/2019	COBIDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS APOPO JUAREZ	19/10/2019	03/12/2019	Q1,700.00	Q100.00	Q301,800.00	Q 60,340.00	Q 241,440.00	100.00%	100.00%	
13	224278	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, 20 DE OCTUBRE, CENTRO ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	26-2019	26-2019	27/09/2019	COBIDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ROLANDO ELETTERIO THU CIA	06/10/2019	26/12/2019	Q5,000.00	Q600.00	Q505,600.00	Q 101,120.00	Q 321,817.50	83.65%	100.00%	
14	224326	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	74-2019	27-2019	27/09/2019	COBIDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	MARLON REHE ARGUETA ESCOBAR	06/10/2019	26/12/2019	Q5,000.00	Q500.00	Q405,500.00	Q 81,100.00	Q 258,087.50	83.65%	100.00%	
15	224235	AMPLIACION INSTITUTO BASICO FOR COOPERATIVA IMEB, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	75-2019	28-2019	02/10/2019	COBIDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY USANDIRO LUCAS LOPEZ	06/10/2019	02/12/2019	Q5,000.00	Q512.00	Q755,512.00	Q 503,333.50	Q 755,512.00	100.00%	100.00%	
16	224232	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDO NIVEL), PARA EL PATZUTZITZ, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	71-2019	29-2019	03/10/2019	COBIDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS APOPO JUAREZ	10/10/2019	03/12/2019	Q4,633.00	Q100.00	Q831,500.00	Q 166,300.00	Q 262,967.02	51.63%	100.00%	

DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Ing. Edgar Manolo Arriola Calderon Mazariegos
Colegiado 15,448
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTO

(Firma manuscrita)
ING. EDGAR MANOLO ARRIOLA CALDERON MAZARIEGOS
DIRECTOR DMP



ANEXO No.2
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN
REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras expresadas en quetzales)

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	EJECUCION DEVENGADA AL 29 DE FEBRERO DE 2020	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		% DE AVANCE FISICO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
												VALOR	%	
1	230212	DOTACION DE AVES Ponedoras Año 2019, VARIAS COMUNIDADES, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	12-2019	17/05/2019	MUNICIPALIDAD	LUCIA FRANCISCA CRUZ RAMIREZ DE HERNANDEZ	23/05/2019	27/05/2019	Q. 324,972.00	Q. 324,972.00	-	Q. 324,972.00	100.00%	100.00%
2	235445	DOTACION DE MATERIALES PARA CALLE Y CAMINO VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	14-2019	01/06/2019	MUNICIPALIDAD	ROSAURA PAXTOR CHANAX	14/06/2019	14/06/2019	Q. 1,125,000.00	Q. 1,125,000.00	-	Q. 1,125,000.00	100.00%	100.00%
3	213560	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PARAJE PACAMAN GHUUL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	10-2019	25/04/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	14/05/2019	08/07/2019	Q. 335,500.00	Q. 335,500.00	-	Q. 335,500.00	100.00%	100.00%
4	230105	AMPLIACION EDIFICIO (S) ALCALDIA COMUNIARIA, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	11-2019	25/04/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE MAX CHOJOLAN TURNIL	14/05/2019	11/09/2019	Q. 558,625.00	Q. 558,625.00	-	Q. 558,625.00	100.00%	100.00%
5	-	COMPRA DE LAMPARAS TIPO LED PARA EL PROYECTO CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	13-2019	04/06/2019	MUNICIPALIDAD	JAIME AURELIANO AGUILAR MATIAS	07/06/2019	07/06/2019	Q. 480,000.00	Q. 480,000.00	-	Q. 480,000.00	100.00%	100.00%
6	230106	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) SALON DE USOS MULTIPLES ALCALDIA COMUNIARIA, PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	31-2019	15/11/2019	MUNICIPALIDAD	RAMON ANIBAL HERNANDEZ OSORIO	28/11/2019	26/12/2019	Q. 325,000.00	Q. 292,500.00	-	Q. 292,500.00	90.00%	100.00%
7	230436	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHILMOB, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	32-2019	15/11/2019	MUNICIPALIDAD	ARNOLDO POJOY LOPEZ	28/11/2019	26/12/2019	Q. 435,660.75	Q. 435,660.75	-	Q. 435,660.75	100.00%	100.00%
8	230435	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CEMENTERIO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	33-2019	15/11/2019	MUNICIPALIDAD	MARLON REHE ARQUETA ESCOBAR	28/11/2019	20/02/2019	Q. 325,000.00	Q. 240,500.00	84,500.00	Q. 325,000.00	100.00%	100.00%
9	230433	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASTAY, ALDEA PAXXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	34-2019	25/11/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	02/12/2019	30/12/2019	Q. 435,500.00	Q. 348,400.00	87,100.00	Q. 435,500.00	100.00%	100.00%
10	230113	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, (ENTECHADO DE PATIO), ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	35-2019	25/11/2019	MUNICIPALIDAD	MARLON REHE ARQUETA ESCOBAR	03/12/2019	26/12/2019	Q. 559,000.00	Q. 335,400.00	223,600.00	Q. 559,000.00	100.00%	100.00%
11	231296	AMPLIACION EDIFICIO (S) ALCALDIA COMUNIARIA SEGUNDO NIVEL, BARRIO CHUISIGUAN ENTRE LA SEGUNDA CALLE Y TERCERA AVENIDA DE LA ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	36-2018	24/11/2019	MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AIPOP JUAREZ	11/12/2019	-	Q. 559,450.00	Q. 119,890.00	-	Q. 119,890.00	20.00%	55.00%
12	230102	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHICOJ A PASUC FASE II, BARRIO XOLIVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	37-2019	06/12/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	16/12/2019	30/12/2019	Q. 511,000.00	Q. 102,200.00	408,800.00	Q. 511,000.00	100.00%	100.00%
13	230116	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHOTZAMBAL CHISAC, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	38-2019	06/12/2019	MUNICIPALIDAD	CARLOS ESTUARDO LOPEZ VASQUEZ	16/12/2019	06/01/2020	Q. 559,000.00	Q. 531,050.00	27,950.00	Q. 559,000.00	100.00%	100.00%



14	230114	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHIRU-CRUZ, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	39-2019	06/12/2019	MUNICIPALIDAD	CARLOS ESTUARDO LOPEZ VASQUEZ	16/12/2019	06/01/2020	Q 435,500.00	Q 413,725.00	Q 21,775.00	Q 435,500.00	100.00%	100.00%
15	230110	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	40-2019	13/12/2019	MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AJPOP JUAREZ	17/12/2019	-	Q 435,500.00	Q 87,000.00	Q -	Q 87,000.00	20.00%	100.00%
16	230434	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ENTRADA PRINCIPAL, PARAJE CHIXUJAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	41-2019	13/12/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE ESTUARDO HERRERA NORIEGA	17/12/2019	30/12/2019	Q 325,000.00	Q 308,750.00	Q 16,250.00	Q 325,000.00	100.00%	100.00%
17	230108	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL HACIA XESUC, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	42-2019	13/12/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE ESTUARDO HERRERA NORIEGA	17/12/2019	30/12/2019	Q 325,000.00	Q 308,750.00	Q 16,250.00	Q 325,000.00	100.00%	100.00%
18	214323	MEJORAMIENTO CALLE, 3ERA. CALLE, ENTRE 1ERA. AVENIDA Y 5TA CALLE DE LA ZONA 2, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	43-2019	27/12/2019	MUNICIPALIDAD	URBANO BONIFACIO OCHOA LOPEZ	03/01/2020	-	Q 850,000.00	Q 170,000.00	Q 455,000.00	Q 625,000.00	73.53%	10.00%



DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
 Ing. Edgar Manolo Calderón Mazariegos
 Colegiado 15,448
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTO.

ING. EDGAR MANOLO ARNOLDO CALDERON MAZARIEGOS
 DIRECTOR DMP


MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO - TOTONICAPAN

INFORME FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, PARAJE CHUIQUI, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

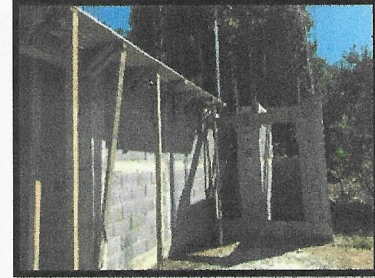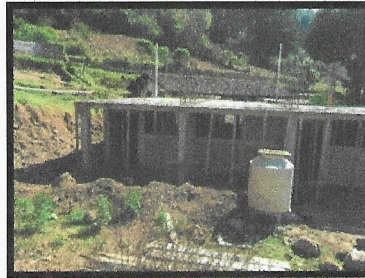

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDO NIVEL) PARAJE PATZUTZU, BARRIO CHISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

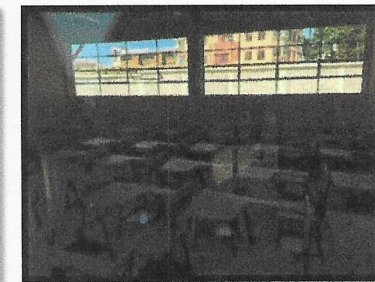

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICHAJ, ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

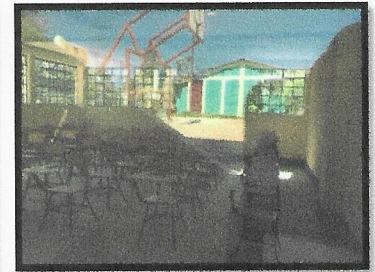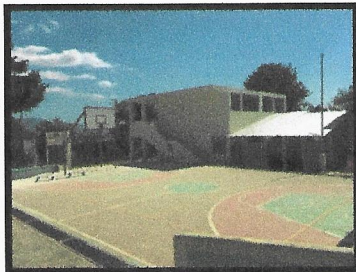


CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN




**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA PABATOC
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



**CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, SECTOR CHITOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**

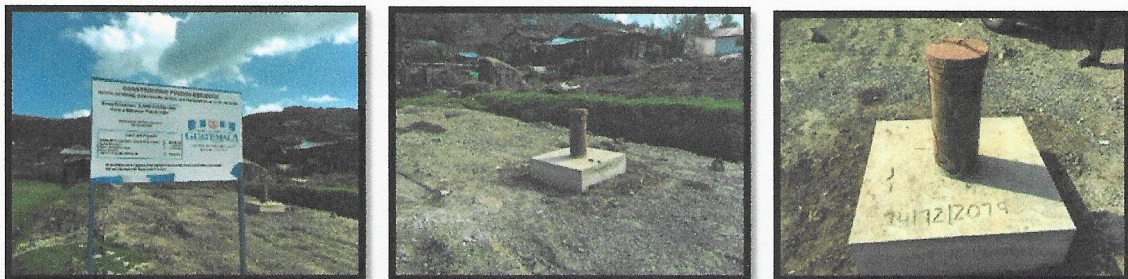

**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARAJE CHONIMACORRAL,
ALDEA SAN ANTONIO SIJA, AN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**

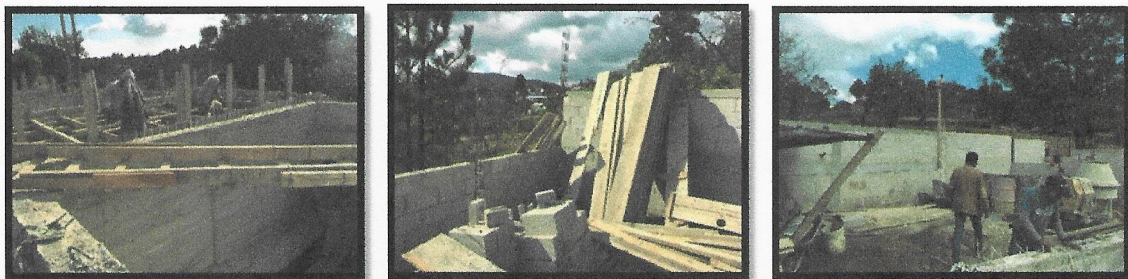

**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, 20 DE OCTUBRE, CENTRO ALDEA TACAALVE
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



**MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD PARAJE PALEMOP ZONA 4
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL,
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ,
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**

