


**San Francisco El Alto, jueves, 06 de febrero de 2020**  
**Oficio No. 056-2020**  
**Ref. DMP**


A: César Miguel Ajpop Zapeta  
Unidad de Información Pública Municipal

Por medio de la presente se le hace entrega de la información requerida según Circular No. 03-2020. UIPM de fecha 24 de enero del presente año 2020, la cual van adjuntas al presente oficio. Sin nada más que agregar, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,



Ing. Edgar Manolo Arnoldo Calderón Mazariegos  
Director Municipal de Planificación





## MISION

Somos una Institución de Gobierno Municipal que Impulsa el desarrollo integral, equitativo y sostenible del Municipio, a través de la recaudación, cooperación, gestión y administración del patrimonio municipal y los servicios públicos de manera eficaz, con una evaluación permanente, promoviendo la organización y participación activa y voluntaria de la población organizada en el Municipio en busca del bien común y la conservación y gestión integrada de los recursos naturales del territorio.

## OBJETIVO

Brindar a la población personal para la seguridad, ordenamiento, ornato en el municipio, además del personal para atención al medio ambiente.

  
Ing. Edgar Manolo Arnoldo Calderón Mazariegos  
Director Municipal de Planificación





1,825  
Guatemala, C.A.

# Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

**ANEXO No.1**  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS DE INVERSIÓN POR FUERTE DE FINANCIAMIENTO  
DEL 01 DE ENERO DE 2020  
(Cifras expresadas en quetzales)

No.	CODIGO SNP	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	No. DE CONVENIO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	APORTES		MONTO DEL CONTRATO TOTAL	EJECUCION DOBLGADA AL 31 DE ENERO DE 2020	EJECUCION DOBLGADA AL 31 DE ENERO DE 2020	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2020	
										CODERE	COMUNIDAD				VALOR	%
1	224333	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENIX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	53-2019	15-2019	29/08/2019	CODERE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ANGEL EMANUEL MARTINEZ JUAREZ	17/09/2019	02/12/2019	Q500,000.00	Q538.00	Q505,638.00	Q 410,312.50	Q 410,312.50	81.16%	100.00%
2	224409	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	54-2019	16-2019	26/08/2019	CODERE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	KEVIN JAISEM GARCIA HERRERA	27/09/2019	-	Q5,000.00	Q600.00	Q405,800.00	Q 297,000.00	Q 297,000.00	73.23%	98.23%
3	224230	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHUJUTZUTZ, SAN ANTONIO SIA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	55-2019	17-2019	29/08/2019	CODERE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	17/09/2019	02/12/2019	Q5,000.00	Q750.00	Q605,750.00	Q 466,354.00	Q 466,354.00	100.00%	100.00%
4	224226	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, PARAJE CHUJUTZUTZ, ALDEA PAXUCAM, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	56-2019	18-2019	06/09/2019	CODERE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	KEVIN JAISEM GARCIA HERRERA	27/09/2019	-	Q5,000.00	Q520.00	Q505,520.00	Q 252,500.00	Q 189,375.00	87.41%	82.90%
5	224234	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y TUBERIA DE CONDUCCION), BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	57-2019	19-2019	06/09/2019	CODERE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	27/09/2019	21/11/2019	Q5,000.00	Q711.00	Q755,711.00	Q 755,711.00	Q 755,711.00	100.00%	100.00%
6	224229	AMPLIACION INSTITUTO BASICO, SECTOR PAPAJE, PARAJE CUESTA DEL GALLO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	60-2019	20-2019	06/09/2019	CODERE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	JOSE ESTUARDO HERRERA INHERRERA	27/09/2019	30/12/2019	Q2,500.00	Q800.00	Q303,300.00	Q 124,781.25	Q 178,518.75	100.00%	100.00%
7	224236	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHUJUTZUTZ, ALDEA PACHAJAL, TOTONICAPAN	58-2019	22-2019	10/09/2019	CODERE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	JUAN RAMOS HERNANDEZ	27/09/2019	02/12/2019	Q5,000.00	Q575.00	Q505,675.00	Q 432,406.50	Q 432,406.50	85.53%	100.00%
8	224410	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, PARAJE PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	59-2019	21-2019	10/09/2019	CODERE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	KEVIN ALBERTO GARCIA HERRERA	27/09/2019	-	Q400,000.00	Q545.00	Q405,645.00	Q 394,875.00	Q 394,875.00	97.37%	95.00%
9	226499	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARAJE CHUJUTZUTZ, ALDEA SAN ANTONIO SIA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	72-2019	30-2019	23/10/2019	CODERE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS AYOPO JUAREZ	25/10/2019	-	Q1,341,853.00	Q100.00	Q1,342,500.00	Q 268,500.00	Q 268,500.00	20.00%	54.00%
10	224343	CONSTRUCCION POZOS MECANICO, SECTOR CHITOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	68-2019	23-2019	26/09/2019	CODERE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	08/10/2019	-	Q800,000.00	Q275,000.00	Q879,805.00	Q 549,428.13	Q 307,931.75	97.45%	98.00%
11	224437	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	69-2019	24-2019	26/09/2019	CODERE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	MIGUEL JIMAZ SALES	08/10/2019	-	Q400,000.00	Q722.00	Q405,722.00	Q 293,574.38	Q 293,574.38	72.36%	76.00%
12	224228	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHIVENTUR, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	70-2019	25-2019	27/09/2019	CODERE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS AYOPO JUAREZ	10/10/2019	03/12/2019	Q1,700.00	Q100.00	Q301,800.00	Q 60,360.00	Q 241,440.00	100.00%	100.00%
13	224276	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, 20 DE OCTUBRE, CENTRO ALDEA PACAJALIVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	26-2019	26-2019	27/09/2019	CODERE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ROMANO FLEUTERO THUUA	08/10/2019	26/12/2019	Q5,000.00	Q600.00	Q505,600.00	Q 101,120.00	Q 321,817.50	85.65%	100.00%
14	224228	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA SACHMIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	74-2019	27-2019	27/09/2019	CODERE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	MARION REBE ARGUETA ESCOBAR	08/10/2019	26/12/2019	Q5,000.00	Q500.00	Q405,500.00	Q 81,100.00	Q 258,687.50	85.65%	100.00%
15	224235	AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IMER, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	75-2019	28-2019	02/10/2019	CODERE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	08/10/2019	02/12/2019	Q5,000.00	Q512.00	Q755,612.00	Q 593,333.50	Q 252,178.50	100.00%	100.00%
16	224232	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDO NIVEL), PARAJE PATZUTZUTZ, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	71-2019	29-2019	08/10/2019	CODERE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS AYOPO JUAREZ	10/10/2019	03/12/2019	Q4,633.00	Q100.00	Q831,500.00	Q 166,300.00	Q 262,967.02	51.63%	100.00%

DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION  
Ing. Edgar Manolo Arnoldo Calderón Mazariegos  
Cosegado 15,448  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

ING. EDGAR MANOLO ARNOLDO CALDERON MAZARIEGOS  
DIRECTOR DNP

Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco\_gt@hotmail.com

www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



# Municipalidad de San Francisco El Alto

## DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

1,825  
Guatemala, G. A.

**ANEXO No.2**  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020  
(Cifras expresadas en quetzales)

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	EJECUCION DEVENGADA AL 31 DE ENERO DE 2020	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2020		% DE AVANCE FISICO A 31 DE ENERO DE 2020
												VALOR	%	
1	230212	DOTACION DE AVES PONEDORAS AÑO 2019, VARIAS COMUNIDADES, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	12-2019	17/05/2019	MUNICIPALIDAD	LUCIA FRANCISCA CRUZ RAMIREZ DE HERNANDEZ	25/05/2019	27/05/2019	Q 324,972.00	Q 324,972.00	Q -	Q 324,972.00	100.00%	100.00%
2	235445	DOTACION DE MATERIALES PARA CALLE Y CAMINO VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	14-2019	01/06/2019	MUNICIPALIDAD	ROSAURA PAXTOR CHANAX	14/06/2019	14/06/2019	Q 1,125,000.00	Q 1,125,000.00	Q -	Q 1,125,000.00	100.00%	100.00%
3	213560	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PARAJE PAGAWAN CHUUL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	10-2019	25/04/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	14/05/2019	08/07/2019	Q 335,500.00	Q 335,500.00	Q -	Q 335,500.00	100.00%	100.00%
4	230105	AMPLIACION EDIFICIO (S) ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	11-2019	25/04/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE MAX CHOJOLAN TURNIL	14/05/2019	11/09/2019	Q 558,625.00	Q 558,625.00	Q -	Q 558,625.00	100.00%	100.00%
5	-	COMPRA DE LAMPARAS TIPO LED PARA EL PROYECTO CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	13-2019	04/06/2019	MUNICIPALIDAD	JAIME AURELIANO AGUILAR MATHIAS	07/06/2019	07/06/2019	Q 480,000.00	Q 480,000.00	Q -	Q 480,000.00	100.00%	100.00%
6	230106	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) SALON DE USOS MULTIPLES ALCALDIA COMUNITARIA, PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	31-2019	15/11/2019	MUNICIPALIDAD	RAMON ANIBAL HERNANDEZ OSORIO	28/11/2019	26/12/2019	Q 325,000.00	Q 292,500.00	Q -	Q 292,500.00	90.00%	100.00%
7	230436	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-LIMOB, ALDEA TACAALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	32-2019	15/11/2019	MUNICIPALIDAD	ARNOLDO POJOY LOPEZ	28/11/2019	26/12/2019	Q 435,660.75	Q 435,660.75	Q -	Q 435,660.75	100.00%	100.00%
8	230435	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CEMENTERO, ALDEA SAQUICUL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	33-2019	15/11/2019	MUNICIPALIDAD	MARLON REHE ARQUETA ESCOBAR	28/11/2019	20/02/2019	Q 325,000.00	Q 240,500.00	Q 84,500.00	Q 325,000.00	100.00%	100.00%
9	230433	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASTAY, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	34-2019	25/11/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	02/12/2019	30/12/2019	Q 435,500.00	Q 348,400.00	Q 87,100.00	Q 435,500.00	100.00%	100.00%
10	230113	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, (ENTECHADO DE PATIO), ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	35-2019	25/11/2019	MUNICIPALIDAD	MARLON REHE ARQUETA ESCOBAR	03/12/2019	26/12/2019	Q 559,000.00	Q 335,400.00	Q 223,600.00	Q 559,000.00	100.00%	100.00%
11	231296	AMPLIACION EDIFICIO (S) ALCALDIA COMUNITARIA SEGUNDO NIVEL, BARRIO CHUISIGUAN ENTRE LA SEGUNDA CALLE Y TERCERA AVENIDA DE LA ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	36-2018	24/11/2019	MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AIPOP JUAREZ	11/12/2019	-	Q 559,450.00	Q 119,890.00	Q -	Q 119,890.00	20.00%	55.00%
12	230102	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHICOJ A PASUC FASE II, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	37-2019	06/12/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	16/12/2019	30/12/2019	Q 511,000.00	Q 102,200.00	Q 408,800.00	Q 511,000.00	100.00%	100.00%
13	230116	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHOTZAMBAL, CHISAC, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	38-2019	06/12/2019	MUNICIPALIDAD	CARLOS ESTUARDO LOPEZ VASQUEZ	16/12/2019	06/01/2020	Q 559,000.00	Q 531,050.00	Q 27,950.00	Q 559,000.00	100.00%	100.00%
14	230114	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHIRI-CRUZ, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	39-2019	06/12/2019	MUNICIPALIDAD	CARLOS ESTUARDO LOPEZ VASQUEZ	16/12/2019	06/01/2020	Q 435,500.00	Q 413,725.00	Q 21,775.00	Q 435,500.00	100.00%	100.00%

Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: [munisanfrancisco\\_gt@hotmail.com](mailto:munisanfrancisco_gt@hotmail.com)

[www.munisanfrancisco.com.gt](http://www.munisanfrancisco.com.gt)

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



# Municipalidad de San Francisco El Alto


DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

*Guatemala C.A.*

**1,825**

15	230110	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUICHAL ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	40-2019	13/12/2019	MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AIPOP JUAREZ	17/12/2019	-	Q	87,000.00	Q	87,000.00	20.00%	95.00%
16	230434	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ENTRADA PRINCIPAL, PARAJE CHIXUJAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	41-2019	13/12/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE ESTUARDO HERRERA NORIEGA	17/12/2019	30/12/2019	Q	325,000.00	Q	325,000.00	100.00%	100.00%
17	230108	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL HACIA XESUC, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	42-2019	13/12/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE ESTUARDO HERRERA NORIEGA	17/12/2019	30/12/2019	Q	325,000.00	Q	325,000.00	100.00%	100.00%
18	214323	MEJORAMIENTO CALLE, 3ERA. CALLE, ENTRE 1ERA. AVENIDA Y 5TA CALLE DE LA ZONA 2, BARRIO CHUSIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	43-2019	27/12/2019	MUNICIPALIDAD	URBANO BONIFACIO OCHOA LOPEZ	03/01/2020	-	Q	850,000.00	Q	170,000.00	73.53%	10.00%

f:   
 ING. EDGAR MANOLO ARNOLDO CALDERÓN MAZARIEGOS  
 DIRECTOR DMP



*Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto*



E-mail: [munisanfrancisco\\_gt@hotmail.com](mailto:munisanfrancisco_gt@hotmail.com)

[www.munisanfrancisco.com.gt](http://www.munisanfrancisco.com.gt)


TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603

# INFORME FOTOGRÁFICO

## CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, PARAJE CHUIQUI, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

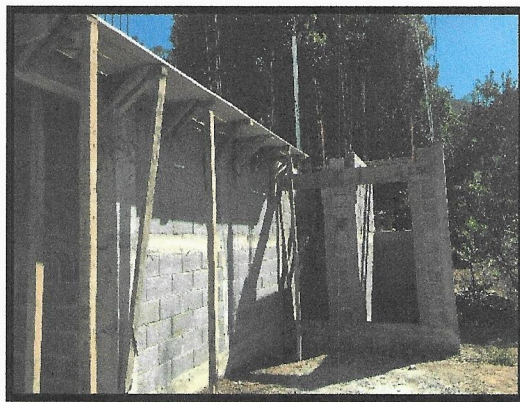
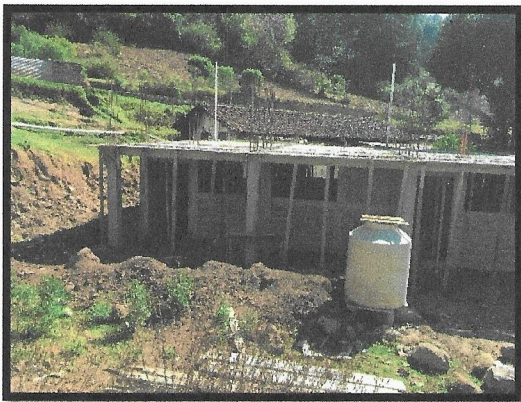


## AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDO NIVEL) PARAJE PATZUTZU, BARRIO CHISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN


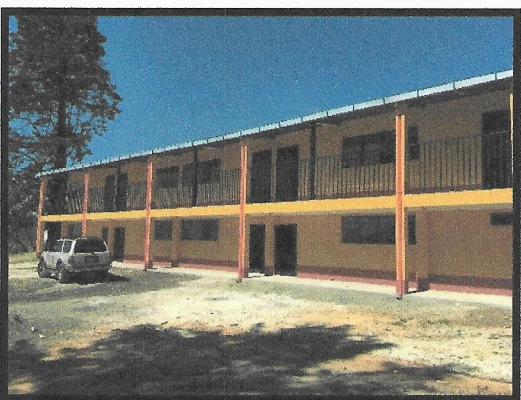


# INFORME FOTOGRÁFICO

## AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICHAJ, ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

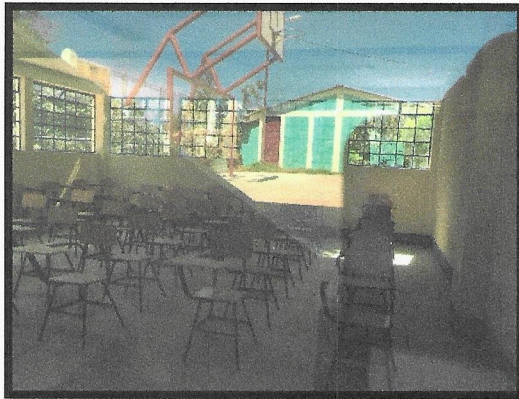
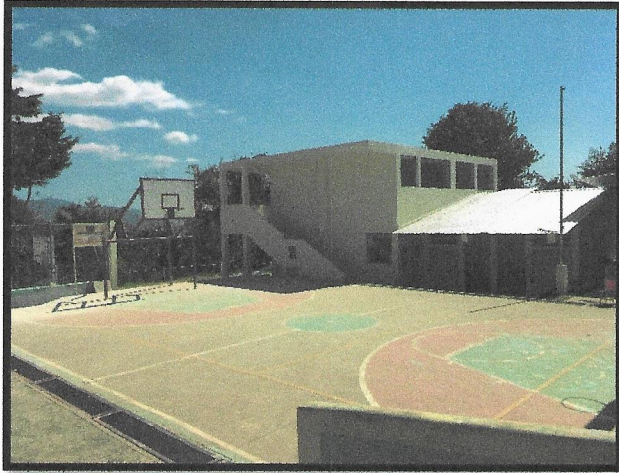


## CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA PABATOC SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

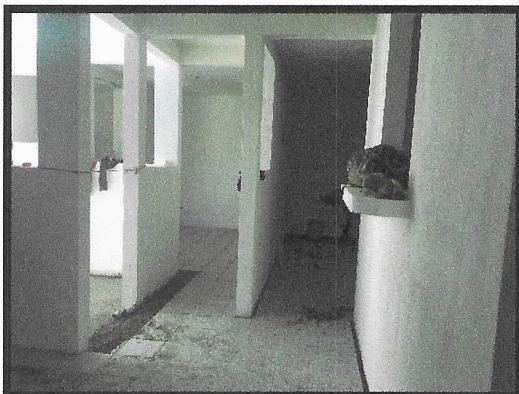
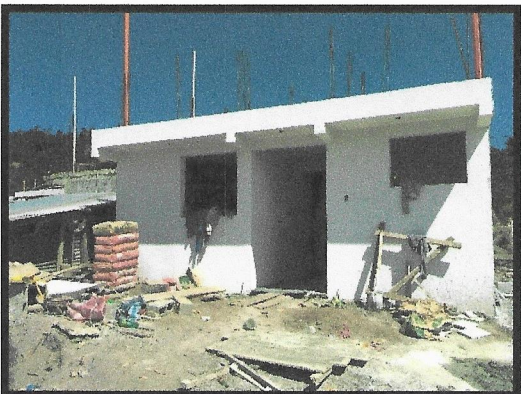


# INFORME FOTOGRÁFICO

## CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

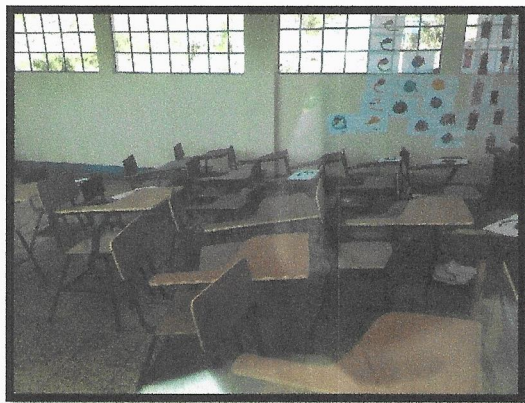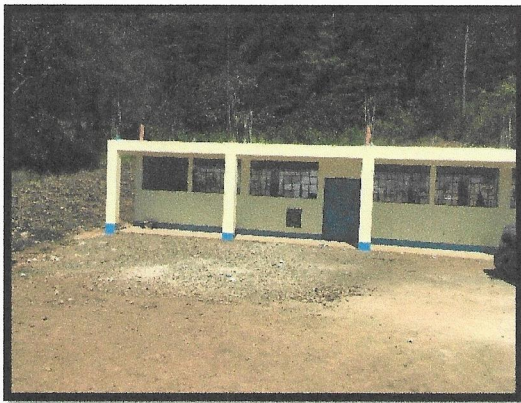



## CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, SECTOR CHITOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

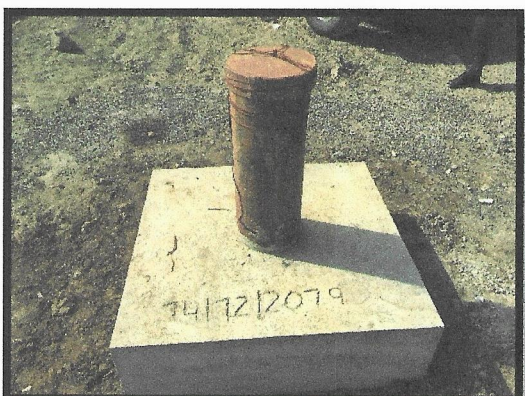





# INFORME FOTOGRÁFICO

## CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, AN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

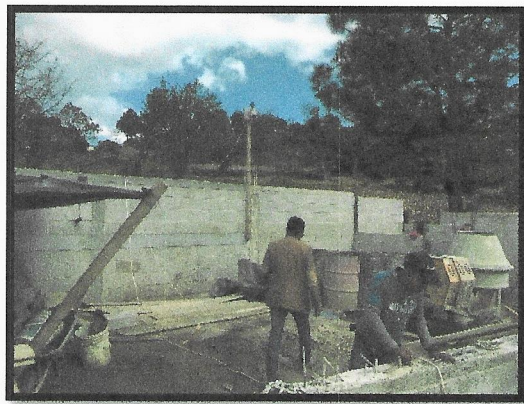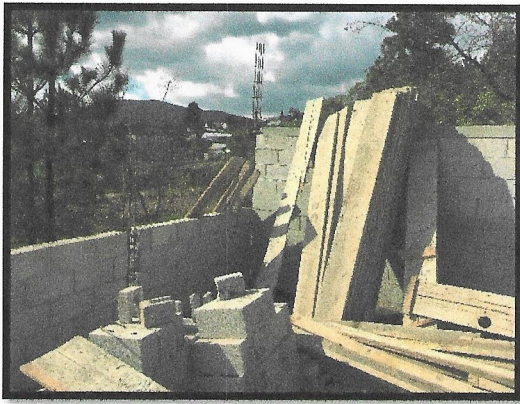


## AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, 20 DE OCTUBRE, CENTRO ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

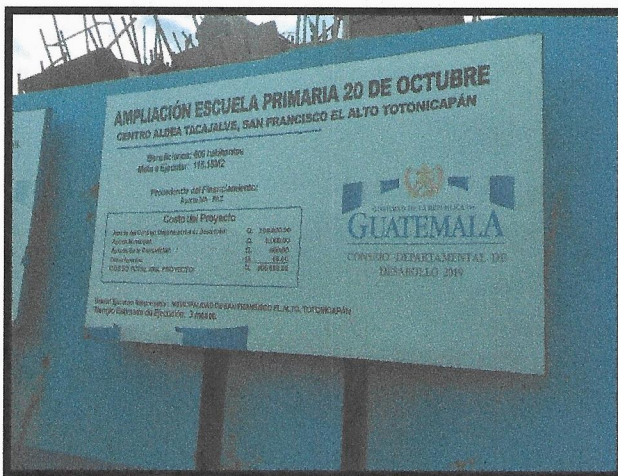

# INFORME FOTOGRÁFICO

## MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD PARAJE PALEMOP ZONA 4 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

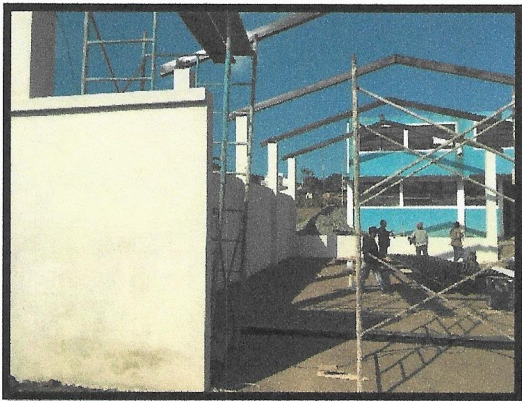

## MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



**DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN**  
Ing. Edgar Manolo Calderón Mazariegos  
Colegiado 15,448  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTO.

